


## 島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成27年11月末現在）

### 1. 主要工程

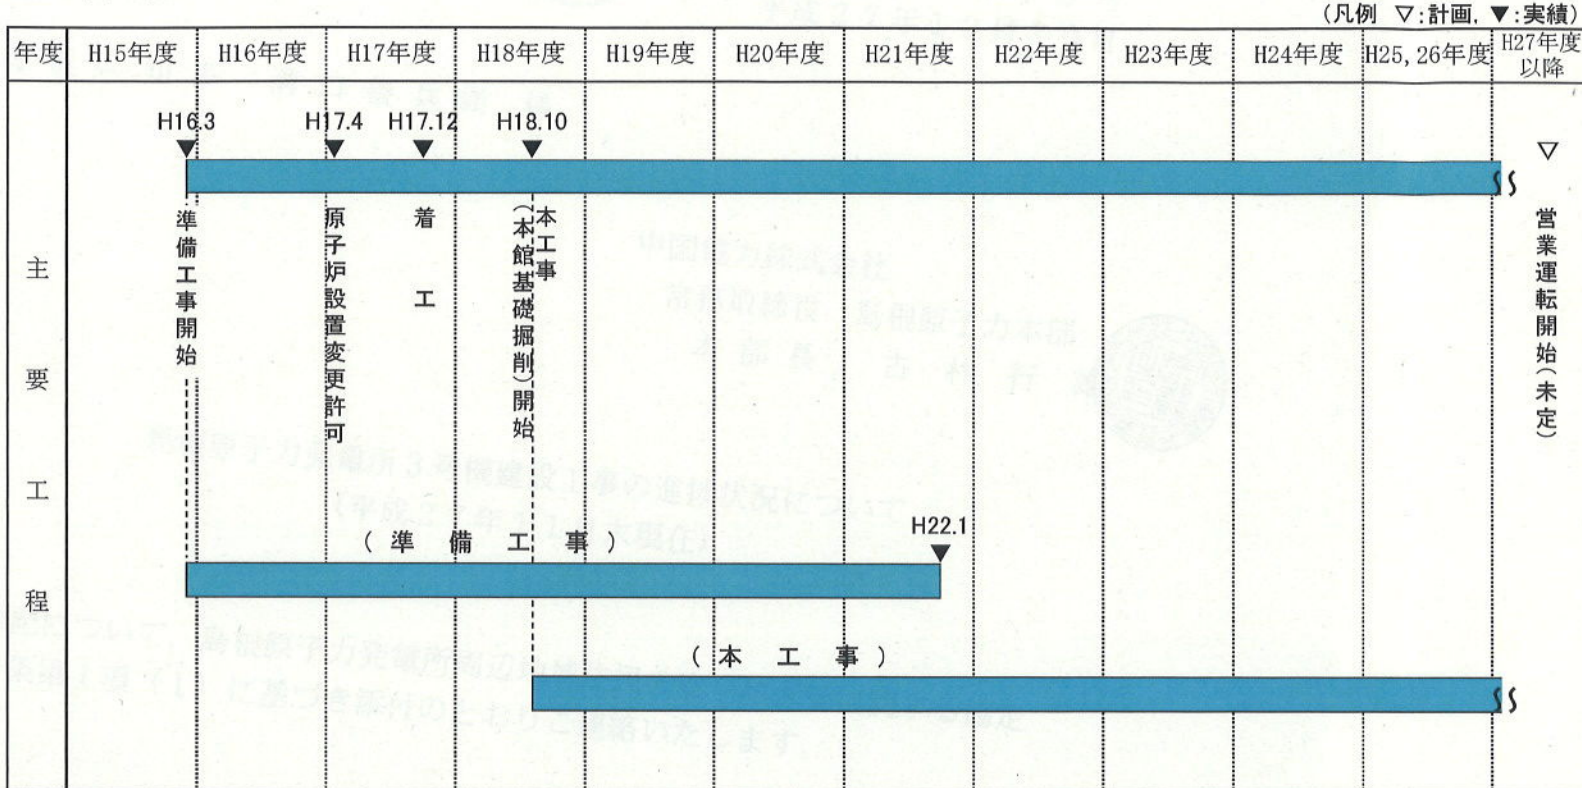

### 4. 建設工事概況

#### (1) 土木工事

- ・フィルタ付ベント設備設置工事
- ・常設代替注水設備設置工事
- ・地下式軽油タンク格納槽他設置工事

#### (2) 建築工事

- ・火災防護対策強化工事
- ・静的触媒式水素処理装置設置工事
- ・燃料プール水位計追加設置工事

#### (3) 機械電気工事

- ・火災防護対策強化工事
- ・静的触媒式水素処理装置設置工事
- ・燃料プール水位計追加設置工事

### 2. 許認可状況


(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9	●第1回工事計画認可(着工)	H17.5.31	H17.12.22
●公有水面埋立竣工許可	-	H22.1.19	●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23	●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26	●第4回工事計画認可	H19.7.31	H20.4.23
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-	●第5回工事計画認可	H20.5.30	H20.12.26
●燃料設備使用承認	H22.8.5	H22.8.27	●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	H21.7.24	H21.10.14
			●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	H21.10.15	H21.11.9
			●工事計画軽微変更届出	H24.1.5	-
			●工事計画変更認可(排気筒)	H25.5.20	H25.7.1

### 3. 工事進捗率

総工事進捗率：一.一%

設備は完成しているが、新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

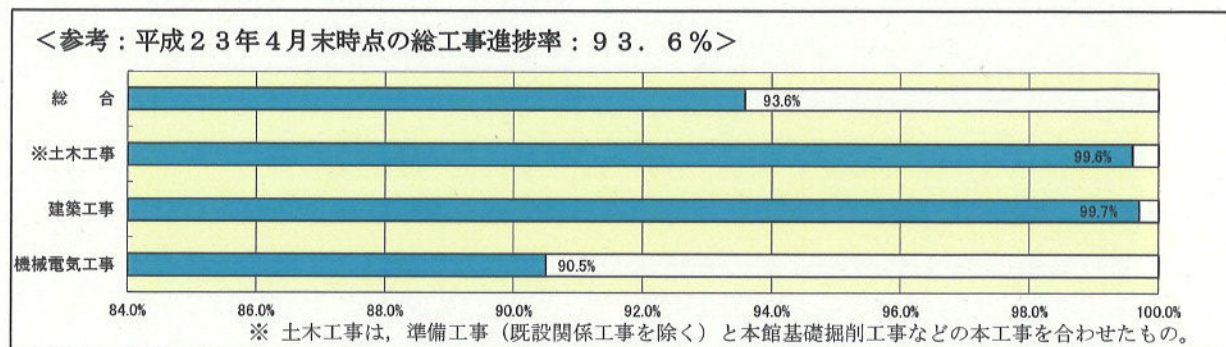

### 5. 建設工事状況写真

