



島根原子力発電所3号機 建設工事の進捗状況（2020年2月末現在）

1. 主要工程

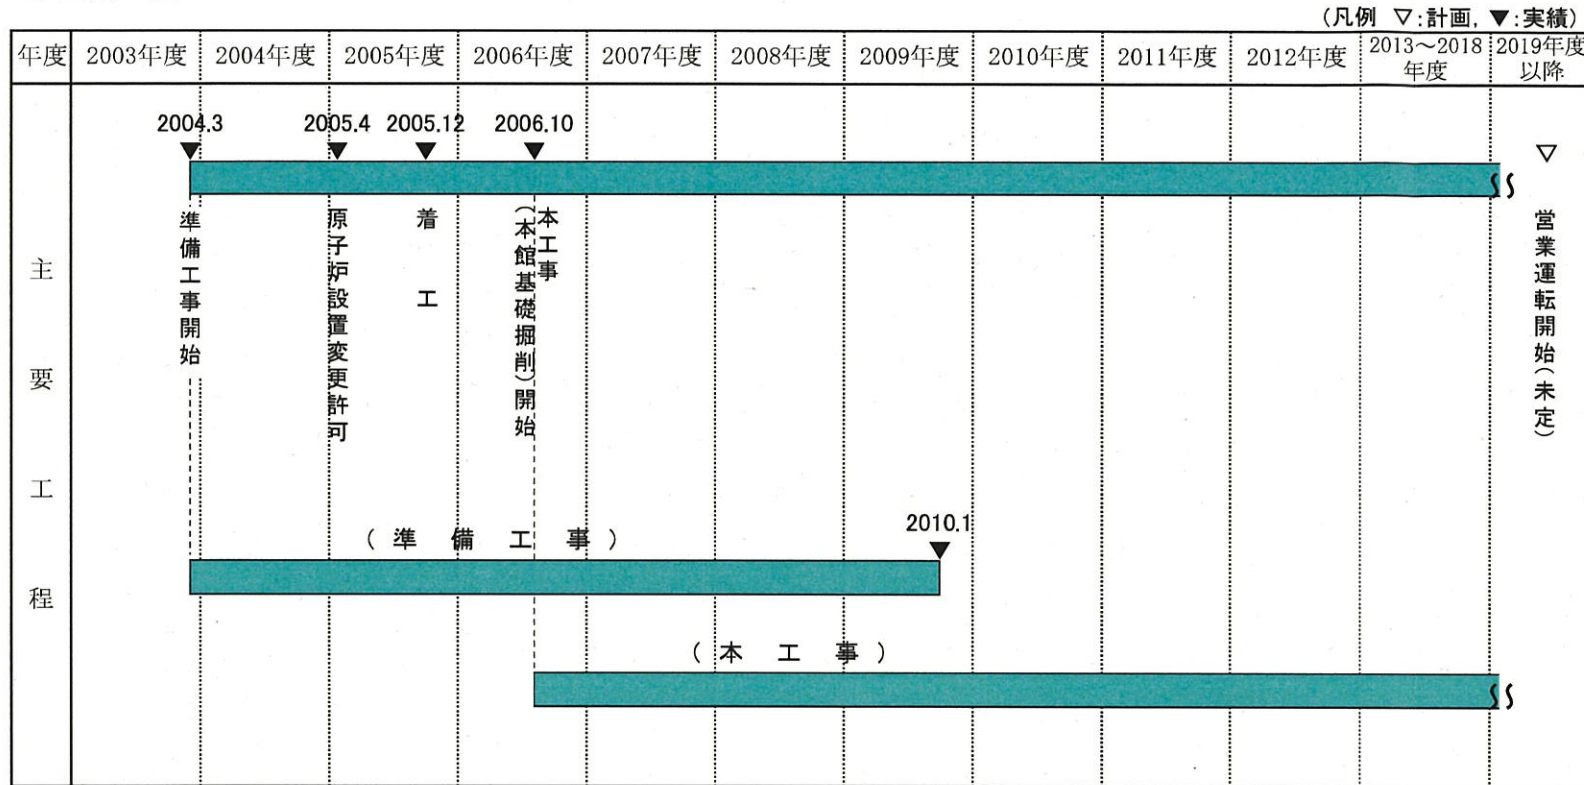

4. 建設工事概況

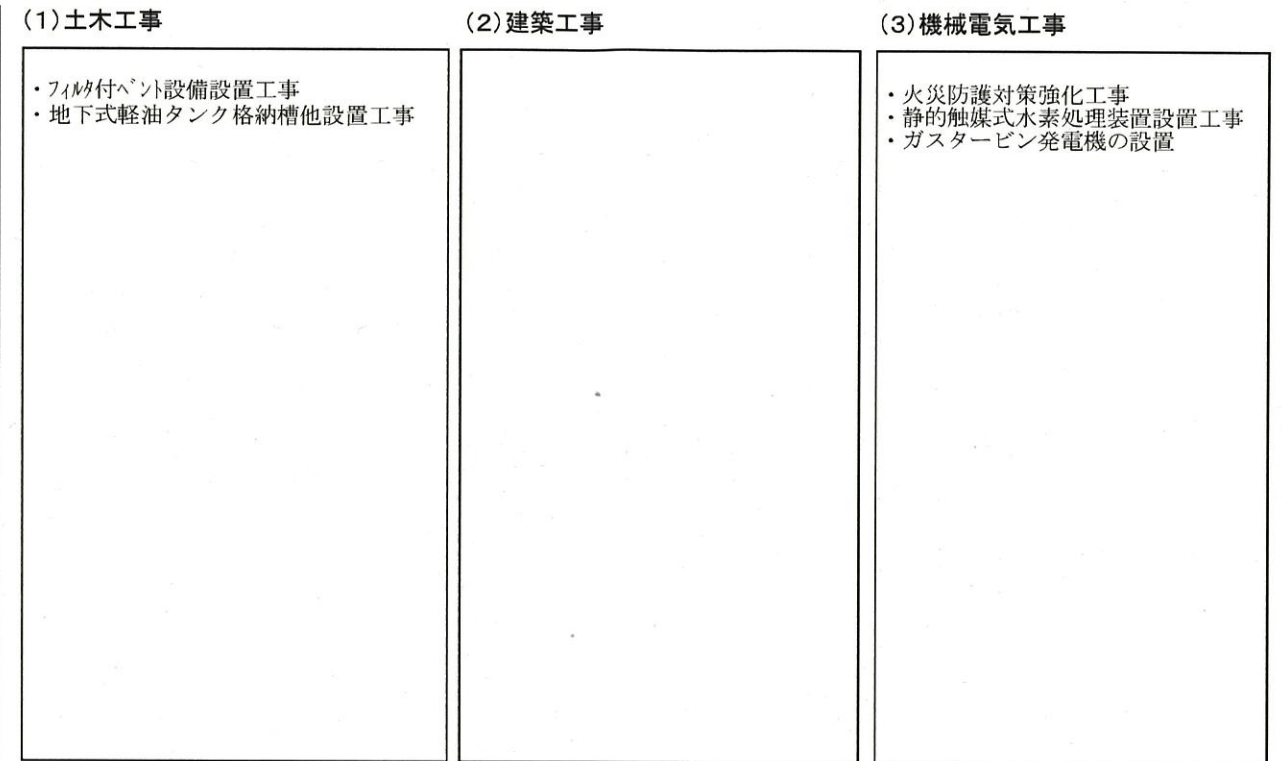

2. 許認可状況


(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	2003. 11. 10	2004. 2. 9	●第1回工事計画認可(着工)	2005. 5. 31	2005. 12. 22
●公有水面埋立竣功許可	-	2010. 1. 19	●第2回工事計画認可	2006. 2. 28	2006. 10. 5
●林地開発許可	2003. 6. 2	2004. 2. 23	●第3回工事計画認可	2006. 11. 30	2007. 5. 22
●原子炉設置変更許可	2000. 10. 4	2005. 4. 26	●第4回工事計画認可	2007. 7. 31	2008. 4. 23
●原子炉設置変更許可(新規制基準適合性審査)	2018. 8. 10	未定	●第5回工事計画認可	2008. 5. 30	2008. 12. 26
●電気工作物変更届出	2005. 5. 23	-	●工事計画変更認可(洗濯廃液処理装置)	2009. 7. 24	2009. 10. 14
●燃料設備使用承認	2010. 8. 5	2010. 8. 27	●工事計画変更認可(排ガス再結合器)	2009. 10. 15	2009. 11. 9
			●工事計画軽微変更届出	2012. 1. 5	-
			●工事計画変更認可(排気筒)	2013. 5. 20	2013. 7. 1

3. 工事進捗率

総工事進捗率：--.-%

設備は完成しているが、新規制基準を踏まえた安全対策工事を実施していること等から、今後の建設工程が確定しないため、進捗率については建設工程が確定した後にお知らせします。

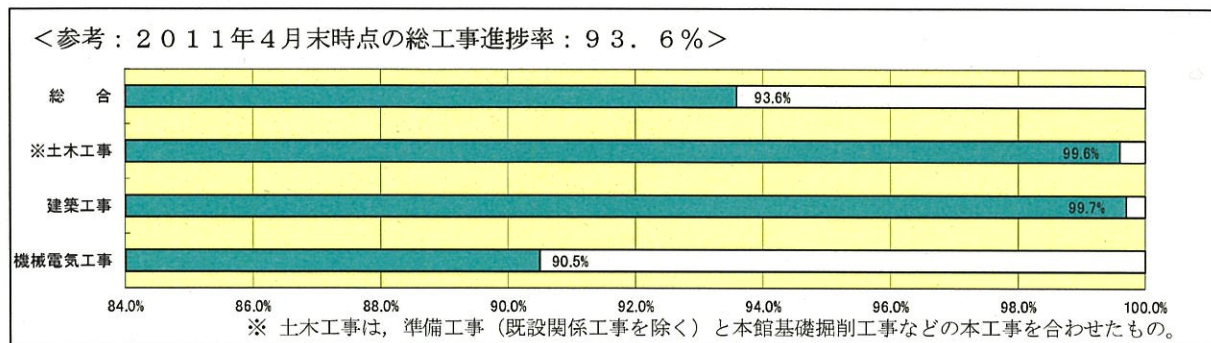

5. 建設工事状況写真

