


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成19年10月末現在）

1. 主要工程

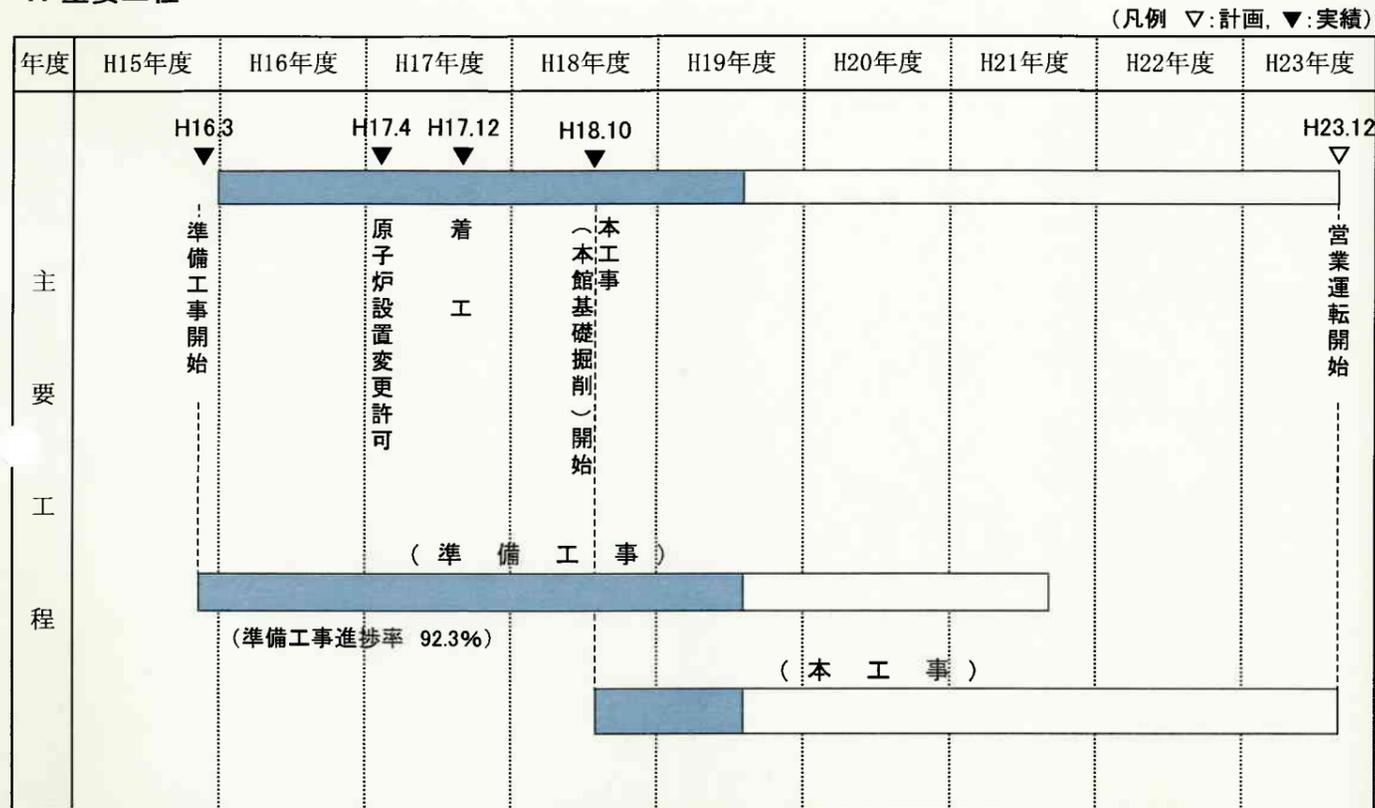


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-
●第1回工事計画認可（着工）	H17.5.31	H17.12.22
●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
○第4回工事計画認可	H19.7.31	申請中

3. 工事進捗率

総工事進捗率：36.4%

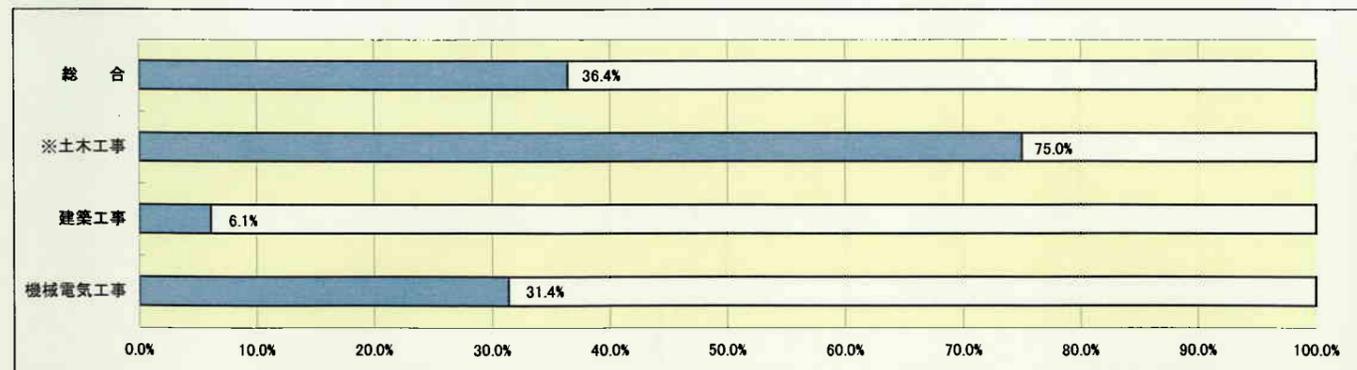

※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- 本館基礎掘削工事
掘削、岩盤清掃、均しコンクリート施工中
地下排水工施工中
- 埋立工事
埋立工事施工中
- 取・放水設備工事
取水槽、取水路コンクリート施工中
- 護岸工事
東護岸波返し壁完了(平成19年度計画分)
- コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中
- 敷地造成工事
西山西側法面切取り、土砂運搬中
法面工、排水工施工中

(2) 建築工事

- 原子炉建物基礎マット施工中
- T構台鉄骨建方完了
- タービン建物基礎マット施工中
- 廃棄物処理建物基礎マット施工中
- 循環水配管エリアコンクリート打設中

(3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器ライナー地組中
- 循環水配管地組中、据付中
- 埋設電線管・配管布設中
- 主要機器製作中
原子炉压力容器
原子炉格納容器
原子炉給水ポンプ
非常用炉心冷却系ポンプ
制御棒駆動機構
制御棒駆動水圧ユニット
非常用ディーゼル発電機
大型表示盤・制御盤等
発電機
復水器 他

5. 建設工事状況写真



敷地西側からの遠景



敷地南側からの全景
