


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成20年1月末現在）

1. 主要工程

(凡例 ▽:計画, ▼:実績)

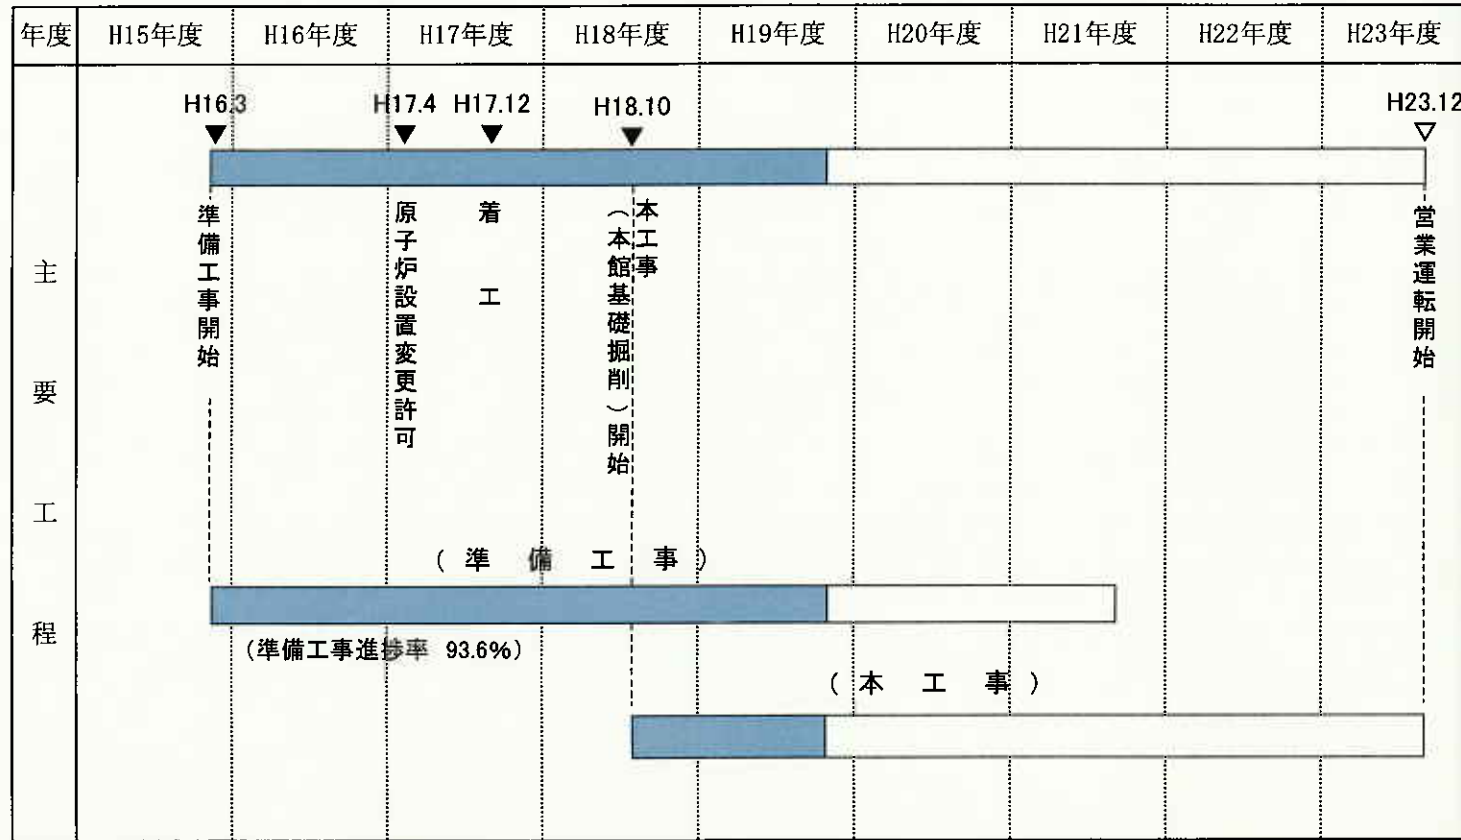


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	
●第1回工事計画認可(着工)	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
○第4回工事計画認可	H19. 7. 31	申請中

3. 工事進捗率

総工事進捗率：41.1%

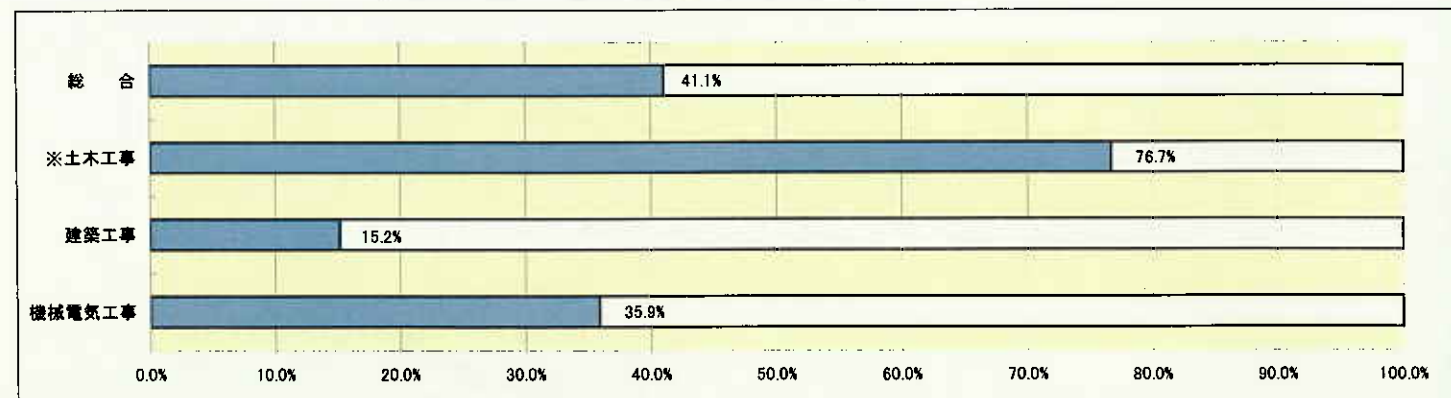

※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- ・埋立工事
埋立工事施工中
- ・取・放水設備工事
取水槽・取水路コンクリート施工中
- ・コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中
- ・敷地造成工事
法面工事, 排水工事施工中

(2) 建築工事

- ・原子炉建物基礎マット・地下躯体工事施工中
- ・タービン建物基礎マット・地下躯体工事施工中
- ・廃棄物処理建物基礎マット・地下躯体工事施工中
- ・制御室建物基礎マット工事施工中
- ・サービス建物基礎マット工事施工中

(3) 機械電気工事

- ・原子炉格納容器ライナー地組中
- ・循環水配管地組中, 据付中
- ・埋設電線管・配管, 機器施工中
- ・主要機器製作中
原子炉圧力容器
シュラウド
原子炉冷却材再循環ポンプ
原子炉格納容器
原子炉給水ポンプ
非常用炉心冷却系ポンプ
制御棒駆動機構
制御棒駆動水圧ユニット
非常用ディーゼル発電機
大型表示盤・制御盤等
発電機
復水器 他

5. 建設工事状況写真



敷地西側からの遠景



敷地南側からの全景
