


# 島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成20年3月末現在）

## 1. 主要工程

(凡例 ▽:計画, ▼:実績)

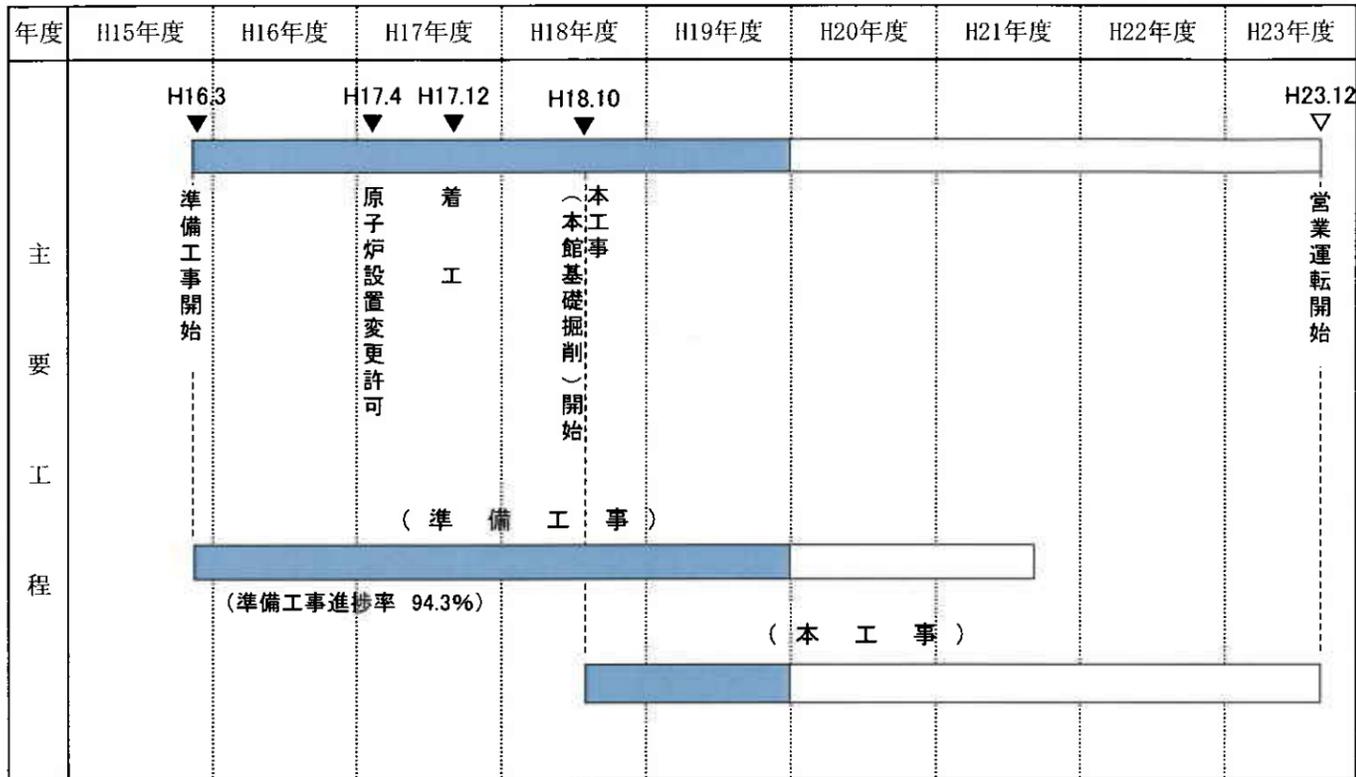


## 2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-
●第1回工事計画認可(着工)	H17.5.31	H17.12.22
●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
○第4回工事計画認可	H19.7.31	申請中

## 3. 工事進捗率

総工事進捗率：43.8%

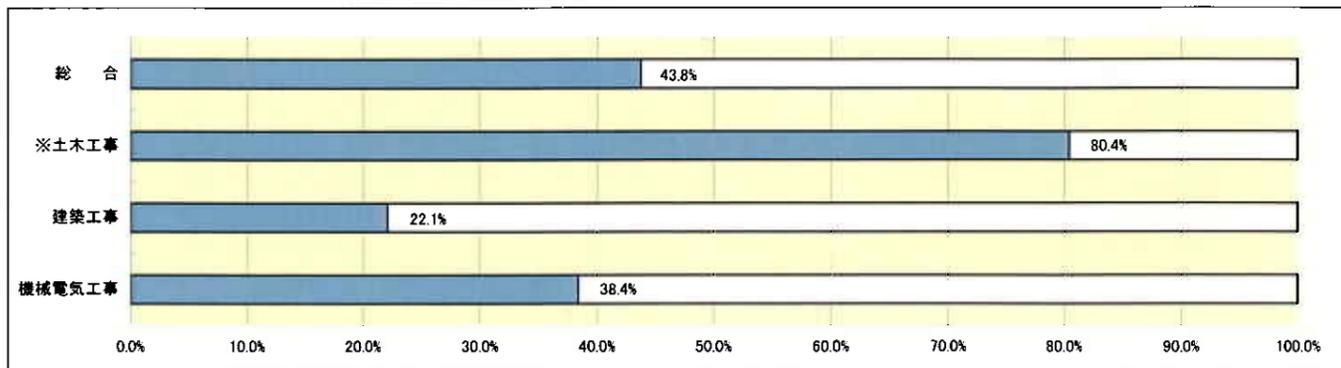

※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

## 4. 建設工事概況

### (1) 土木工事

- 埋立工事  
埋立工事施工中
- 取・放水設備工事  
取水路トンネル掘削中  
取水槽・取水路コンクリート施工中
- コンクリート製造運搬工事  
コンクリート製造・運搬中
- 敷地造成工事  
法面工事、排水工事完了

### (2) 建築工事

- 原子炉建物地下躯体工事施工中
- タービン建物地下躯体工事施工中
- 廃棄物処理建物地下躯体工事施工中
- 制御室建物地下躯体工事施工中
- サービス建物地下躯体工事施工中

### (3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 循環水配管据付け中
- 埋設電線管・配管、機器施工中
- 主要機器製作中  
原子炉圧力容器  
シュラウド  
原子炉冷却材再循環ポンプ  
原子炉格納容器  
原子炉給水ポンプ  
非常用炉心冷却系ポンプ  
制御棒駆動機構  
非常用ディーゼル発電機  
大型表示盤・制御盤等  
発電機  
復水器 他

## 5. 建設工事状況写真



敷地西側からの遠景



敷地南側からの全景
