


# 島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成20年6月末現在）

## 1. 主要工程

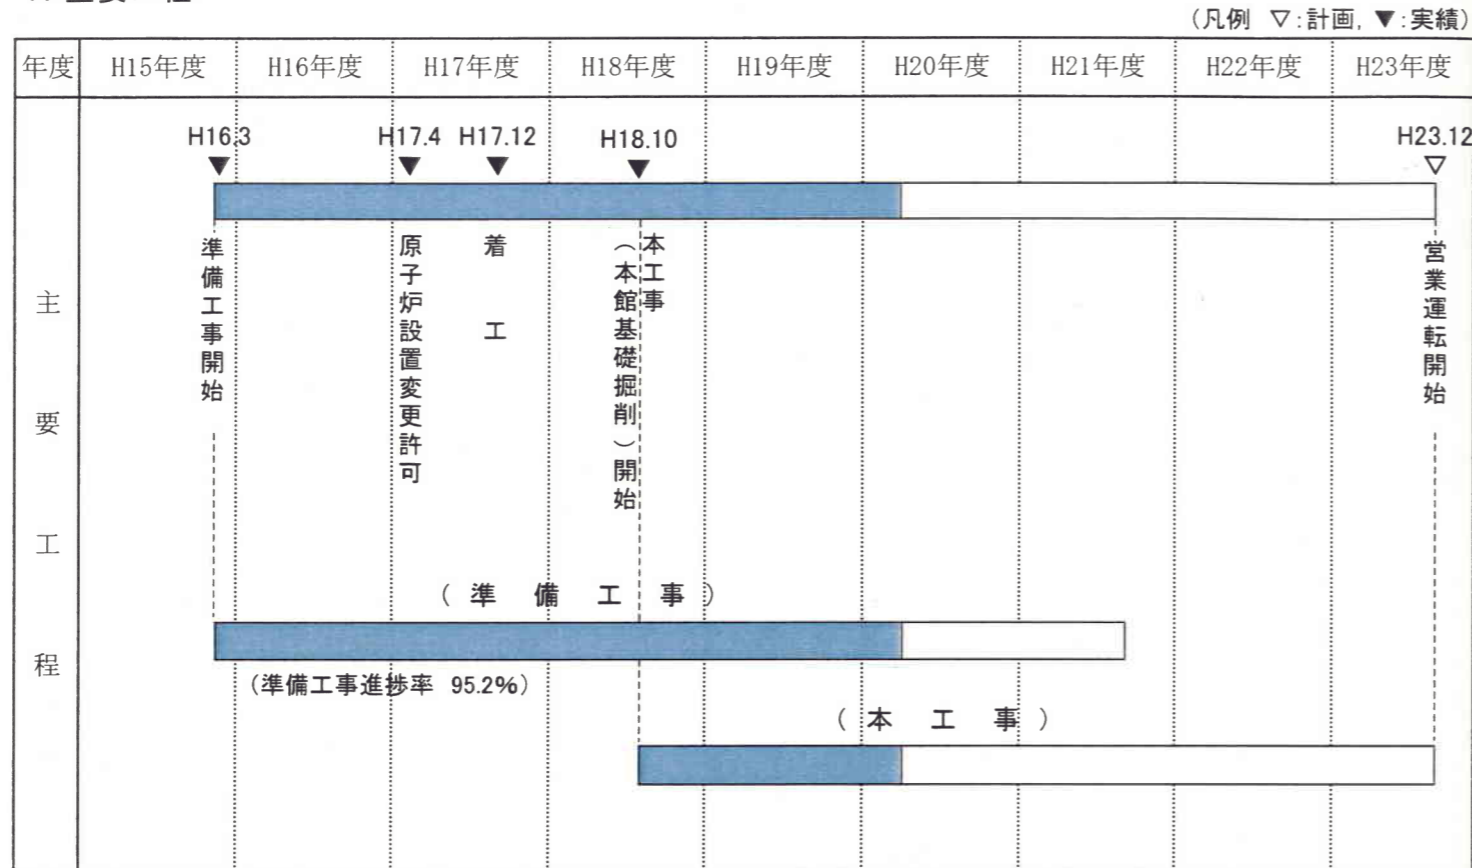


## 2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15. 11. 10	H16. 2. 9	●第1回工事計画認可（着工）	H17. 5. 31	H17. 12. 22
●林地開発許可	H15. 6. 2	H16. 2. 23	●第2回工事計画認可	H18. 2. 28	H18. 10. 5
●原子炉設置変更許可	H12. 10. 4	H17. 4. 26	●第3回工事計画認可	H18. 11. 30	H19. 5. 22
●電気工作物変更届出	H17. 5. 23	-	●第4回工事計画認可	H19. 7. 31	H20. 4. 23
			○第5回工事計画認可	H20. 5. 30	-

## 3. 工事進捗率

総工事進捗率：49.8%

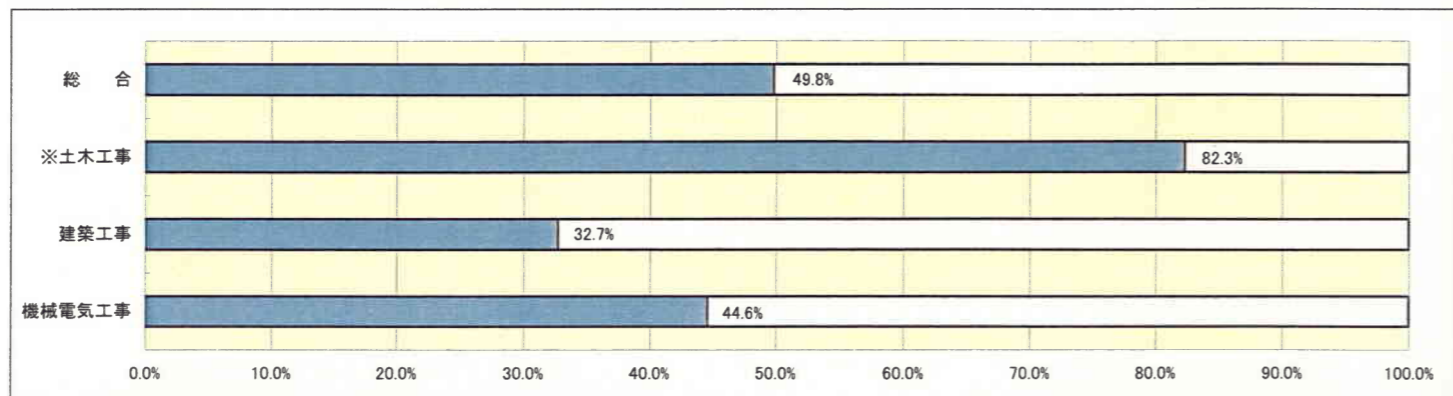

※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

## 4. 建設工事概況

### (1) 土木工事

- 埋立工事  
埋立工事施工中
- 取・放水設備工事  
取水路トンネル掘削中  
放水路掘削中  
取水槽・取水路コンクリート施工中  
放水槽コンクリート施工中
- コンクリート製造運搬工事  
コンクリート製造・運搬中

### (2) 建築工事

- 原子炉建物地下躯体工事施工中
- タービン建物地下躯体工事施工中
- 廃棄物処理建物地下躯体工事施工中
- 制御室建物地下・地上躯体工事  
施工中
- サービス建物地下躯体工事  
施工中

### (3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 復水器据付け中
- 循環水配管据付け中
- 埋設電線管・配管、機器  
施工中
- 主要機器製作中  
原子炉圧力容器  
シュラウド  
原子炉冷却材再循環ポンプ  
原子炉格納容器  
原子炉給水ポンプ  
非常用炉心冷却系ポンプ  
制御棒駆動機構  
非常用ディーゼル発電機  
大型表示盤・制御盤等  
蒸気タービン  
循環水ポンプ  
発電機  
復水器 他

## 5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景
