


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成21年6月末現在）

1. 主要工程

(凡例 ▽:計画, ▼:実績)

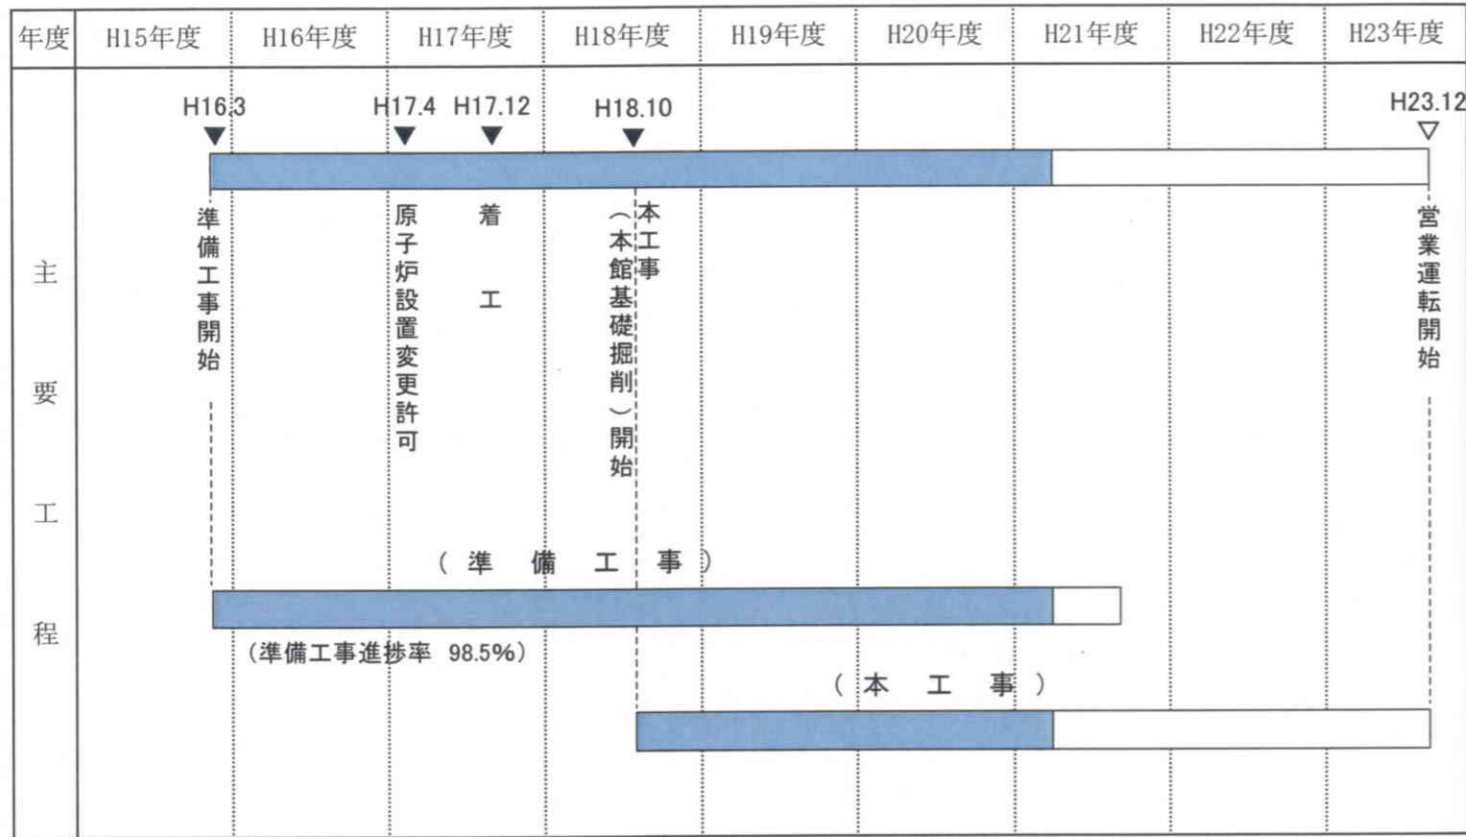


2. 許認可状況

(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9	●第1回工事計画認可(着工)	H17.5.31	H17.12.22
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23	●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26	●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-	●第4回工事計画認可	H19.7.31	H20.4.23
			●第5回工事計画認可	H20.5.30	H20.12.26

3. 工事進捗率

総工事進捗率：69.0%

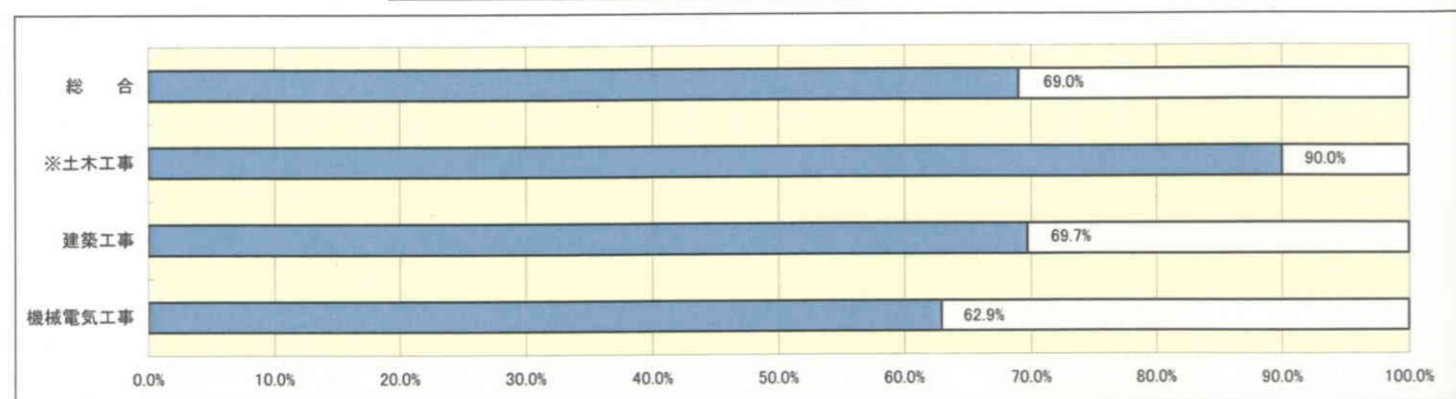

※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

4. 建設工事概況

(1) 土木工事

- 埋立工事
埋立工事施工中
- 取・放水設備工事
取水トンネル巻立コンクリート
施工中
取水槽コンクリート施工中
- 機械基礎工事
屋外開閉所基礎コンクリート施工中
復水貯蔵タンク他基礎掘削中
- コンクリート製造運搬工事
コンクリート製造・運搬中

(2) 建築工事

- 原子炉建物地上躯体工事施工中
- タービン建物地上躯体工事施工中
- 廃棄物処理建物地上躯体工事施工中
- 制御室建物仕上げ工事施工中
- サービス建物地上躯体工事施工中
- 出入管理建物基礎工事施工中
- 補助ボイラー建物他仕上げ工事
施工中

(3) 機械電気工事

- 原子炉格納容器据付け中
- 電線管、配管、機器施工中
- 主要機器製作中
原子炉圧力容器
シュラウド
原子炉冷却材再循環ポンプ
原子炉格納容器
制御棒駆動機構
大型表示盤・制御盤等
蒸気タービン
循環水ポンプ
発電機
補助変圧器 他

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景
