


島根原子力発電所3号機建設工事進捗状況（平成23年8月末現在）

1. 主要工程

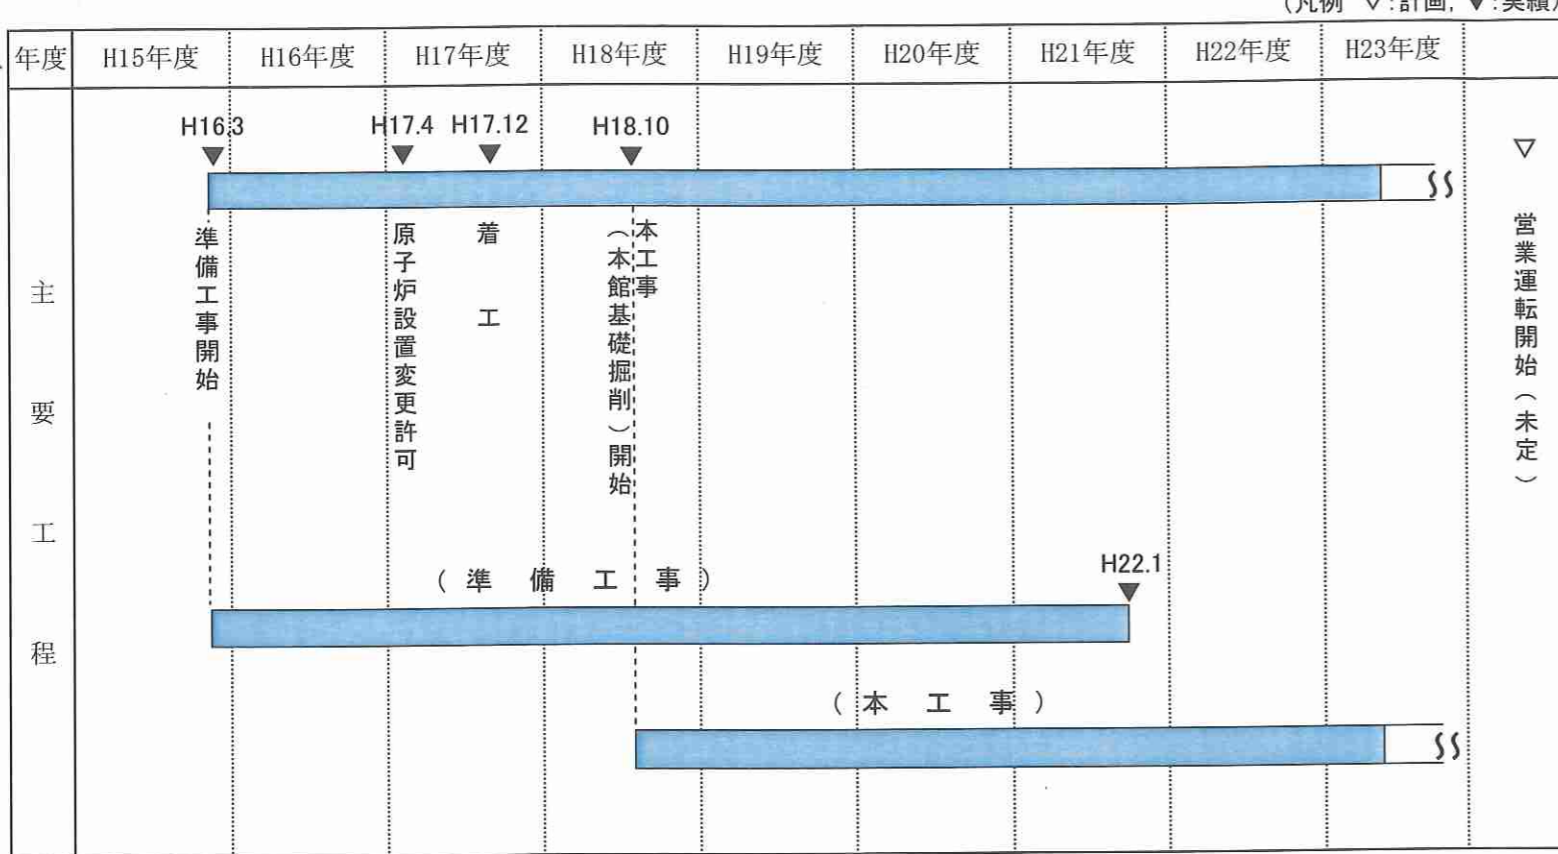

4. 建設工事概況

(1) 土木工事	(2) 建築工事	(3) 機械電気工事
<ul style="list-style-type: none"> 構内整備工事 構内道路・排水路他施工中 	<ul style="list-style-type: none"> 工事完了（津波対策工事を除く） 	<ul style="list-style-type: none"> FMC RD 現地確認試験に向け据付中

2. 許認可状況


(凡例 ○:提出, ●:許認可)

項目	提出日	許認可日	項目	提出日	許認可日
●公有水面埋立免許	H15.11.10	H16.2.9	●第1回工事計画認可（着工）	H17.5.31	H17.12.22
●公有水面埋立竣工許可	-	H22.1.19	●第2回工事計画認可	H18.2.28	H18.10.5
●林地開発許可	H15.6.2	H16.2.23	●第3回工事計画認可	H18.11.30	H19.5.22
●原子炉設置変更許可	H12.10.4	H17.4.26	●第4回工事計画認可	H19.7.31	H20.4.23
●電気工作物変更届出	H17.5.23	-	●第5回工事計画認可	H20.5.30	H20.12.26
●燃料設備使用承認	H22.8.5	H22.8.27	●工事計画変更認可（洗濯廃液処理装置）	H21.7.24	H21.10.14
			●工事計画変更認可（排ガス再結合器）	H21.10.15	H21.11.9

3. 工事進捗率

総工事進捗率：--.-%

現在、制御棒駆動機構（FMC RD）の不具合および福島第一原子力発電所の事故を踏まえた安全対策への対応のため、建設工程が確定しないことから、進捗率については建設工程が確定した後、算出し、お知らせします。
<参考：平成23年4月末時点の総工事進捗率：93.6%>

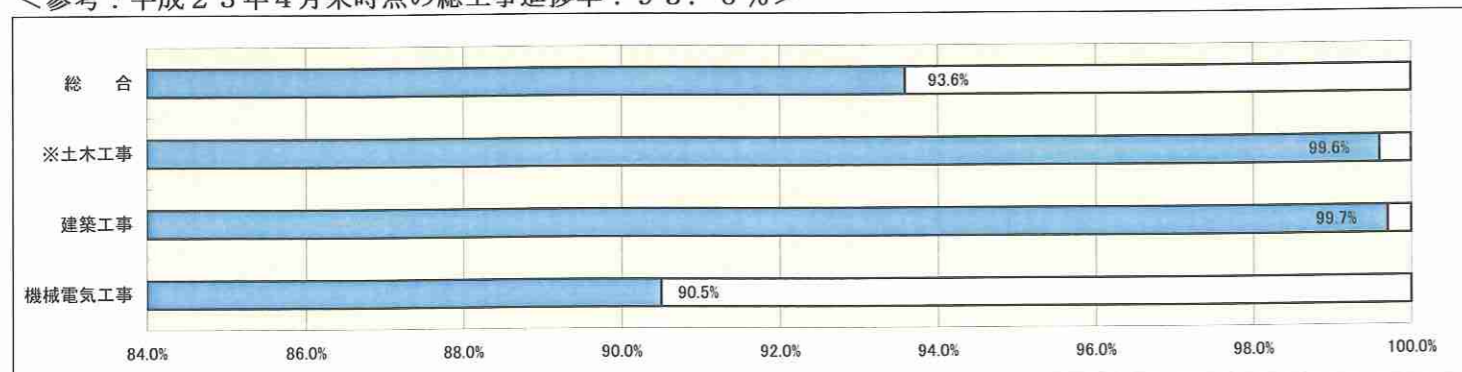


※土木工事は、準備工事（既設関係工事を除く）と本館基礎掘削工事などの本工事を合わせたもの。

5. 建設工事状況写真



敷地南側からの全景

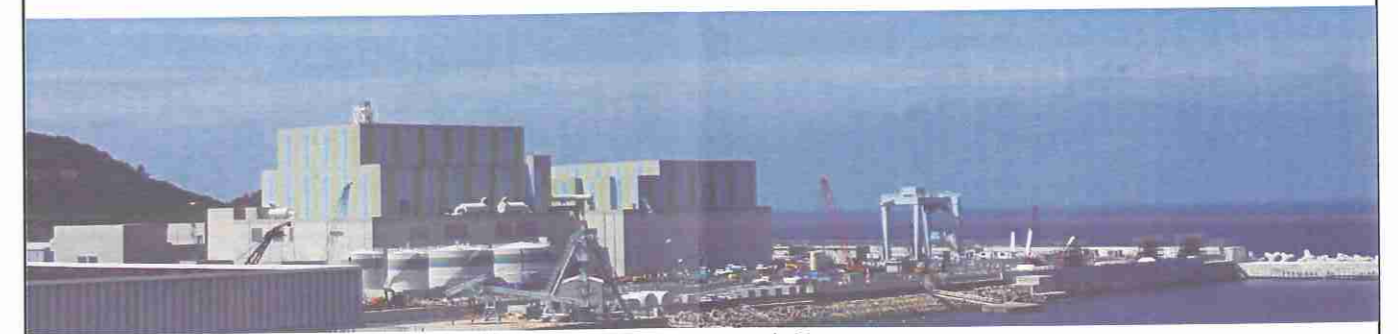

敷地東側からの全景
