


匹見地域 道づくりだより

日頃より島根県の事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
本紙では、匹見地域で実施中の道路事業についてご紹介します。

匹見地域では **7つの工区** で事業を実施しています

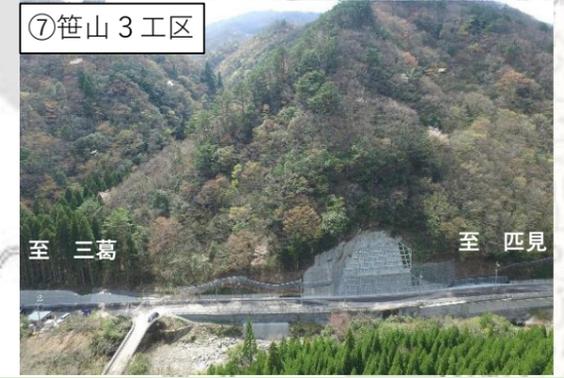

※工事期間中は通行規制などによりご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

裏面では、それぞれの工区の進捗状況や今後の予定についてご紹介します

①長沢バイパス (H16～R2完成予定)

【現在の状況】

工区終点側（匹見側）の拡幅工事と第1トンネル、第2トンネルの中間部の落石を防ぐ工事を行っています。

【今後の予定】

現在施工中の拡幅工事完了後、舗装工事を実施し、2車線拡幅が完了します。

また、長沢第2トンネル終点側（匹見側）の落石を防ぐ工事も今年度実施予定です。

R2年度の完成を目指しています。

イメージ図



②澄川工区 (H29～)

【現在の状況】

道路本線の設計が完了し、現在は落石対策工や河川の護岸、擁壁などの構造物の設計を行っています。

【今後の予定】

設計作業が完了すると、早ければ今年度後半から、事業に必要な土地の測量調査を行う予定です。土地境界の確認が必要となりますので、関係者の皆様のご協力をお願いします。

澄川工区 事業全体図



③広瀬工区 (H30～R2完成予定)


【現在の状況】

平成30年度から事業がスタートしました。センターラインのない区間を川側に拡幅し、2車線改良を行う工事を行っています。また、落石対策工の設計も実施中です。

【今後の予定】

設計作業が完了すると、早ければ今年度後半から、事業に必要な土地の測量調査を行う予定です。土地境界の確認が必要となりますので、関係者の皆様のご協力をお願いします。

イメージ図

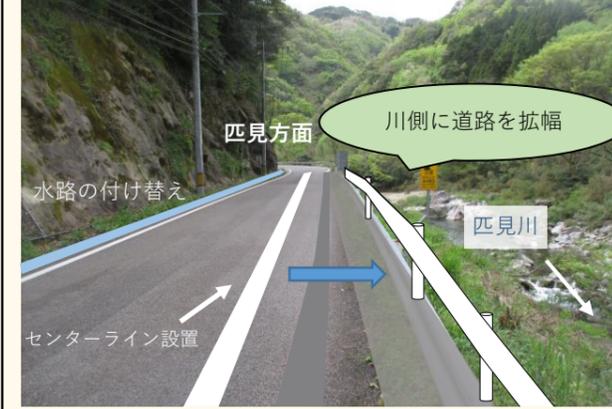

④道谷上3工区 (H30～今年度完成)

【現在の状況】

昨年末に落石を防ぐ工事が完了し、現在は川側に道路を拡幅する工事を行っています。

【今後の予定】

現在施工中の工事は秋ごろには完了予定で、この工事が終了すると、当工区の工事は**完了となります**。



⑤落合工区 (H24～R4完成予定)

【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事を2箇所、落石を防ぐ工事を1箇所で行っています。

【今後の予定】

現在の工事は秋頃に完了する予定ですが、引き続き、山側への拡幅工事を行う予定です。今年度には横田側の200m間、来年度には匹見側の350m間が完成する予定です。今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

第7期工事の施工状況



⑥匹見工区 (H28～今年度完成)

【現在の状況】

当工区は県道波佐匹見線と国道488号の交差点改良を行っています。昨年度はバイパス区間の一部を施工し、まもなく国道488号部分の道路改良工事に着手する予定です。

【今後の予定】

道路改良工事が完了すると、舗装工事を行って匹見工区の事業は完了となります。**今年度中の完成**を目指しています。

イメージ図



⑦笹山3工区 (H21～R4完成予定)

【現在の状況】

三坂林道との交差点付近の改良工事、落石対策工事が昨年度までに完成し、現在は交差点より少し奥（三葛側）にある山の掘削工事を行っています。

【今後の予定】

山の掘削工事が完了すると、来年度には引き続き舗装工事を行い、三坂林道との交差点付近の約400m区間が完成となります。また、今年の秋頃からは三葛橋の架け替え工事に着手します。この工事には3年程度かかる見込みです。

イメージ図



【工事に伴う交通規制へのご協力のお願い】

現在施工中の第14期工事（山の掘削工事）は、道幅も狭く、山も切り立っていることから、工区内で最難関の工事です。防護柵を設置して作業を行いますが、作業時の落石も懸念されるため、作業中は全面通行止めとしています。関係地区の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、安全に最大限配慮しつつ、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

このたび、匹見地域での道路改良事業について皆様にお知らせするため、「匹見地域道づくりだより」を発行することとしました。今後も事業の進捗にあわせて随時お知らせする予定ですので、ご意見・ご質問等あれば下記までご連絡ください

【問い合わせ先】

島根県 益田県土整備事務所

土木工務第一課

課長：三原 担当：三島、竹田、今若

TEL：(0856)-31-9665
