




谷地区だより

第9号

～江の川水系流域治水プロジェクト～

2026年9月

1. 県施工区間の進捗状況について

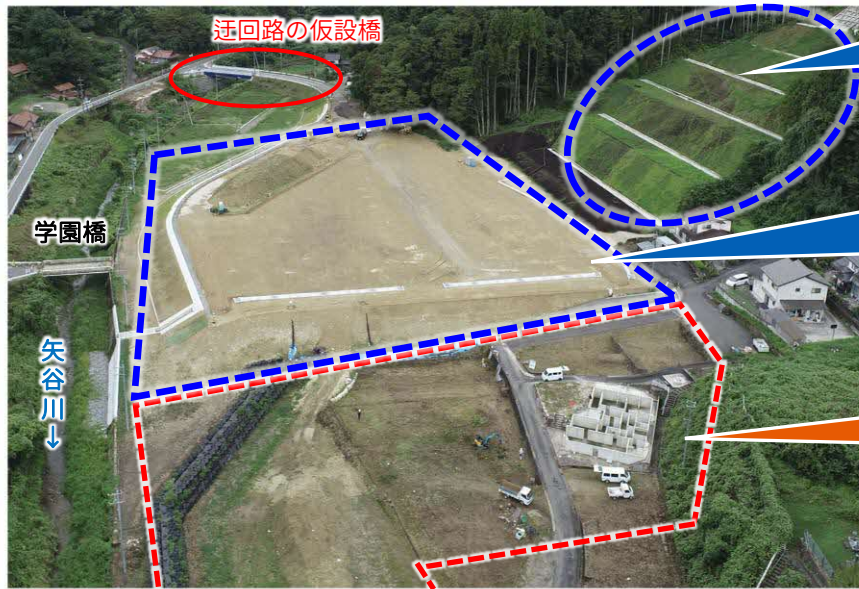

第1土取り場の掘削が完了しました。

先行整備エリアの2区画分の造成工事が完了しました。


先行整備エリア残り1区画の造成を行います。

2. 県施工区間の今後の予定について

◎川本小学校裏の第2土取り場から土を運搬し、先行整備エリアの残り1区画の造成を行います。

◎造成は令和8年度内の嵩上げ完了を目標としています。

◎令和9年度中にライフラインと区画道路の整備を完了させる予定です。

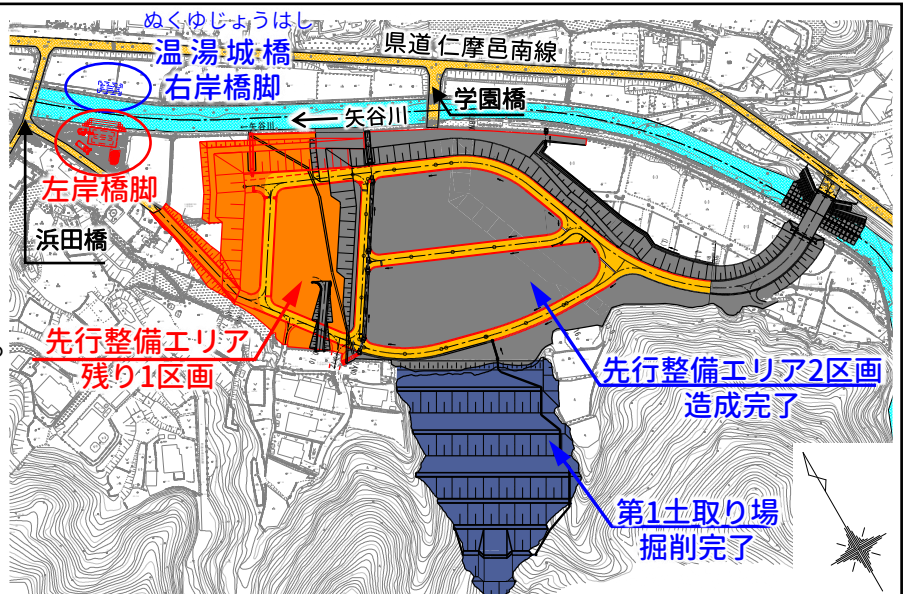

施工内容
(先行整備エリア)

令和8年度					令和9年度		
完了!	8月	9月	～	3月	4月	～	3月
2区画造成		残り1区画造成			区画道路舗装		
					上下水道・電気通信整備		

☆説明会等を随時実施して、皆さまのご意見を伺います。

☆島根県県央県土整備事務所のホームページで事業情報を随時更新しています。

また、過去の谷地区だよりもご覧になれます。

矢谷川 流域治水



3. 国施工区間の進捗状況と今後の予定について

【調査・設計】

令和7年度（実施済み）

- ・橋梁架け替え工事の関係機関協議
- ・関係機関協議を受けての道路修正設計、施工計画検討

令和8年度（予定）

- ・土砂運搬路の設計（上半期中）

【用地】

令和7年度（実施済み）

- ・Bブロックの用地買収を一部実施

令和8年度（予定）


- ・Aブロックの一部について用地調査および用地買収
- ・取水（水道）設備移設用地の取得
- ・Bブロックの用地協議

地域の皆さまには
引き続きご理解、ご協力をお願い
いたします。



国施工区間のスケジュール

項 目		R7	R8	R9	R10	R11	R12
調査・設計	道路修正設計	■					
	施工計画検討	■					
	土砂運搬路検討	■					
用地	用地調査	■	■	■	■	■	■
	用地取得		■	■	■	■	■
工事			■	■	■	■	■

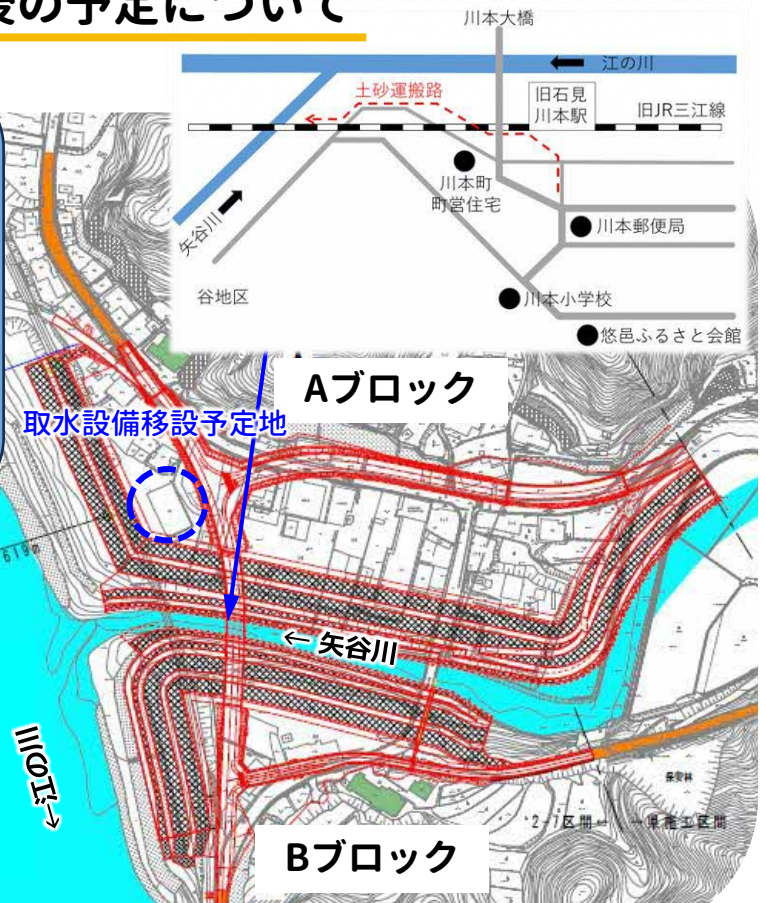

【工事】

令和8年度（予定）

- ・取水（水道）設備の移設工事
- ・土砂運搬路の施工（下半期着手）

発行・お問い合わせ先

国土交通省 浜田河川国道事務所 江の川流域治水推進室	☎ 54-0377	担当：田村
島根県 県央県土整備事務所 土木工務第一課	☎ 72-9631	担当：勝田
川本町 地域整備課	☎ 72-0637	担当：小瀧
