





宇迦橋の架け替え工事のため、 迂回路と工事用仮橋を設置します



神門通り線2工区では、宇迦橋の架け替えにあたり、今年の3月から迂回路を設置する工事を進めています。今後、12月頃から迂回路の舗装、安全施設の設置を予定しており、来年の2月頃を目処に、迂回路に交通を切り替える予定です。また、宇迦橋の架け替えの作業スペースを確保するため、堀川に工事用仮橋を設置する工事に着手いたします。

今後、交通規制などによりご不便をおかけすることになりますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

迂回路（仮橋区間）の構造

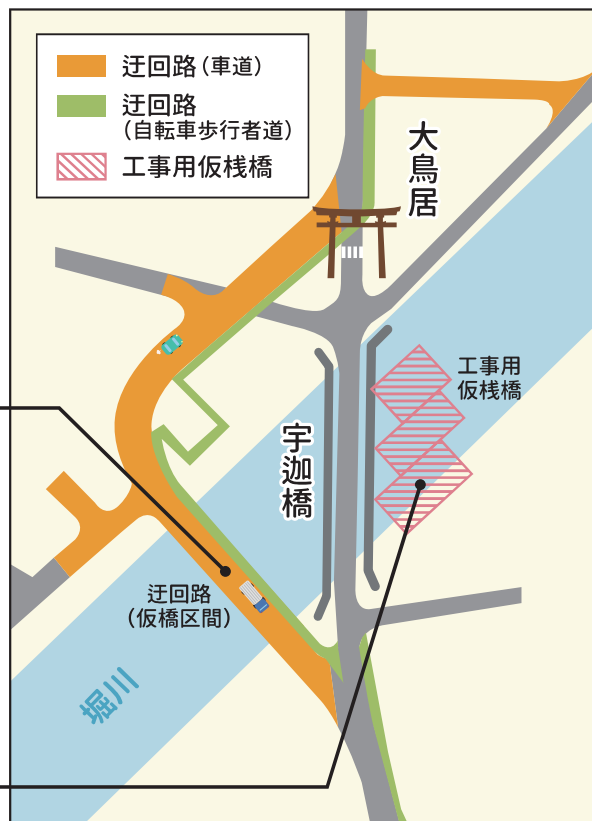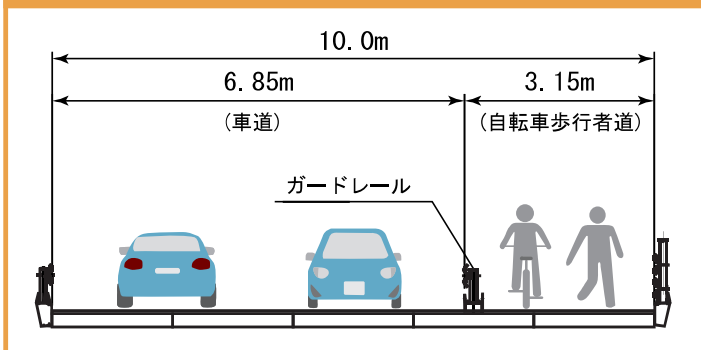

工事用仮橋の設置業者より

この度、島根県出雲県土整備事務所より宇迦橋の架け替え工事に使用する、工事用仮橋の設置工事を受注し施工することになりました。皆様方には、何かとご迷惑をおかけすると思いますが、最善の努力を尽くす所存でございます。皆様方のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



仮橋設置工事受注業者：株式会社 中筋組
工期：令和2年10月6日～令和3年3月25日

宇迦橋撤去までの流れ

スケジュール		令和元年度	令和2年度				令和3年度	
		1月	4月	7月	10月	1月	4月	6月
1 迂回路 設置工事	迂回路の設置		[Orange bar]					
	迂回路の舗装					[Orange bar]		
迂 回 期 間							[Blue bar]	
2 宇迦橋 架け替え工事	工事用仮橋の設置					[Red bar]		
	宇迦橋の撤去						[Red bar]	


歴史ある松を保全する取組



- 神門通りの松並木のうち、迂回路の設置箇所に植えられていた松については、移植を行いました。
- 樹木医の方による健康状態の観察を定期的に行っている他、水や肥料を与えて、大切に保全しています。
- 移植した松は、迂回路の撤去に併せて、神門通りのもとの位置に戻す計画ですが、植える位置の詳細については、地域の皆様と話し合いながら決めていきます。

神門通り線2工区 工事の大まかな工程

交通の切り替えは随時お知らせします

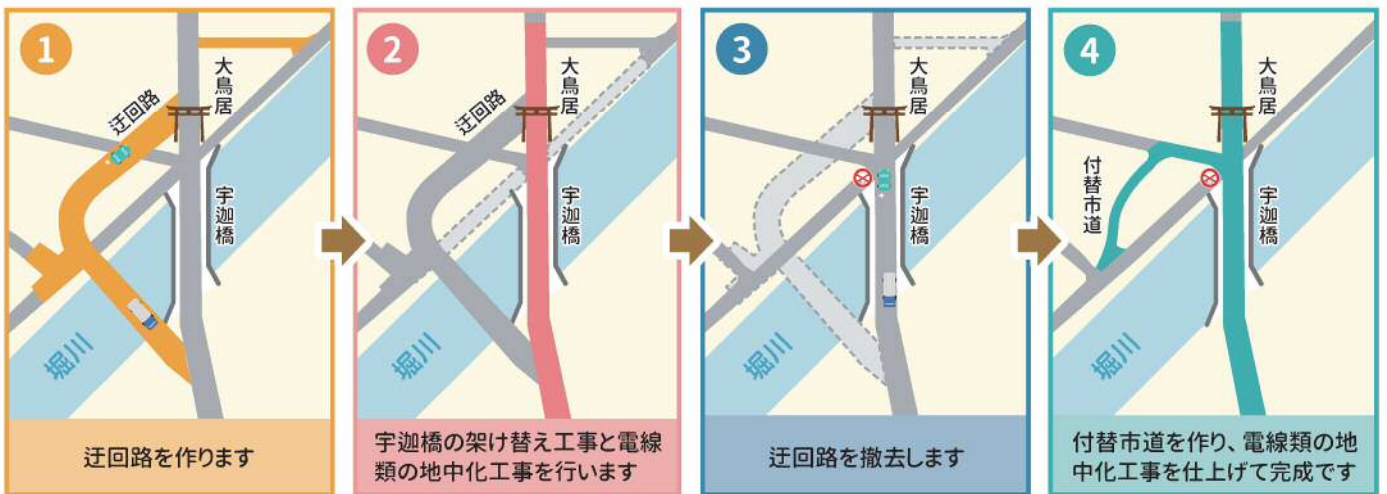

スケジュール	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
迂回路設置工事		①				
宇迦橋架け替え工事						
電線類の地中化工事						④
迂回路撤去工事					③	
付替市道工事					④	

令和2年10月時点の工程です
⇒令和5年6月現在工程精査中

※予算等の都合によりスケジュールは変更となる可能性があります。その他、関連する上下水道工事が行われます。

出雲県土整備事務所 都市整備課からのメッセージ

残暑も終わり過ごしやす季節となってきたところですが、皆様どうお過ごしでしょうか。さて、神門通りの迂回路工事につきましては、皆様のご理解ご協力もあり、順調に工事を進めているところです。11月以降は、迂回路の安全施設や舗装を行う予定です。できるかぎり沿道の皆様にご不便、ご迷惑をおかけしないよう、工夫しながら進めていきたいと考えておりますので、引き続き工事へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

また、春に開催する予定であった工事説明会を中止したことで、皆様に十分にご説明ができていないのではと感じています。工事のことや今後のスケジュールのことについて、お気づきの点やご不明な点などがあれば、お気軽に出雲県土整備事務所都市整備課までご連絡ください。

