

日頃より島根県の事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。本紙では、匹見地域で実施中の道路事業についてご紹介します。

匹見地域では **6の工区** で事業を実施しています ※⑦道谷上3工区は昨年度完了



## ⑦美都匹見線（道谷上3工区）完成しました

道路幅員が狭く、車両同士の離合が困難な箇所にて道路拡幅工事、落石対策工を実施しました。今後は車両同士の離合も容易になり、安全な交通が可能になると期待されます。

【完成前】



【完成後】



### ①長沢バイパス (H16～今年度完成)

#### 【現在の状況】

長沢第1トンネル、第2トンネルの中間部及び第2トンネル匹見側出口の落石を防ぐ工事を行っています。

#### 【今後の予定】

落石対策及び舗装工事を実施し、2車線改良が完了します。

**今年度中の完成**を目指しています。

#### 【昨年度工事完成写真】



### ②澄川工区 (H29～)

#### 【現在の状況】

道路本線の設計が完了し、現在は河川の護岸、擁壁などの構造物の設計や、工事に必要となる土地の測量調査を行っています。

#### 【今後の予定】

土地の測量調査が完了すると、工事に係る用地の買収を行い、早ければ今年度中に落石対策工事を実施する予定です。また、並行して、トンネル区間の詳細な設計を行うための調査も実施します。

澄川工区 事業全体図



### ③広瀬工区 (H30～)

#### 【現在の状況】

昨年度、センターラインのない区間を川側に拡幅し、2車線改良工事を行いました。現在は、落石対策工事に必要となる土地の測量調査を行っています。

#### 【今後の予定】

土地の測量調査が完了次第、落石対策工事を実施します。また、一部2車線改良が未実施の区間についても工事を行う予定にしております。

#### 【昨年度工事完成写真】



### ⑥笹山3工区 (H21～)

#### 【現在の状況】

三葛橋の右岸側橋台（橋を支える構造物）が完成しました。また、昨年度に引き続き三坂林道との交差点から100m程度吉賀側の改良工事を行っています。

#### 【今後の予定】

秋頃に三坂林道との交差点付近の約400m区間について舗装工事を予定しております。

また、同じく秋ごろに三葛橋の左岸側の橋台工事を予定しております。

#### 【右岸側橋台完成写真】



### ④落合工区 (H24～)

#### 【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事を2箇所行っています。

#### 【今後の予定】

現在の工事は秋～冬頃に完了する予定ですが、引き続き、山側への拡幅工事を行う予定です。また、秋頃には匹見側の440m間の舗装工事を実施する予定です。今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

#### 【昨年度工事完成写真】



### ⑤匹見工区 (H28～今年度完成)


#### 【現在の状況】

県道波佐匹見線と国道488号の交差点改良を行っています。昨年度は国道488号部分の道路改良工事を実施しました。現在は、舗装工事を実施しています。

#### 【今後の予定】

舗装工事が完了すると、匹見工区は完成となります。また、**7月31日**からはバイパス区間の通行が可能となります。


イメージ図

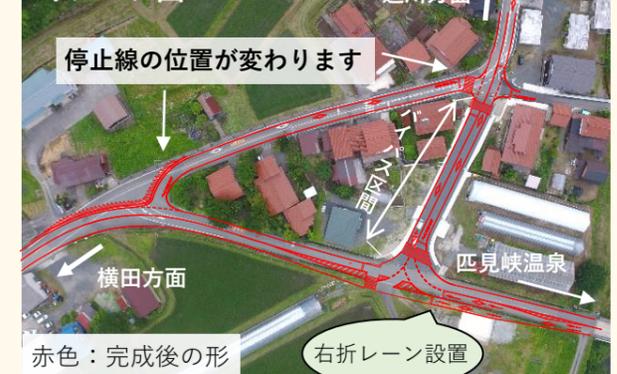

### ご協力をお願い

現在、匹見地域では様々な箇所で道路改良工事を行っており、それぞれの箇所で交通規制を行っています。また、工事関係の大型車両が各地で多く走行しております。地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますが、事業を迅速かつ安全に行うため、今後ともご協力をお願いします。

#### 【規制箇所位置図】

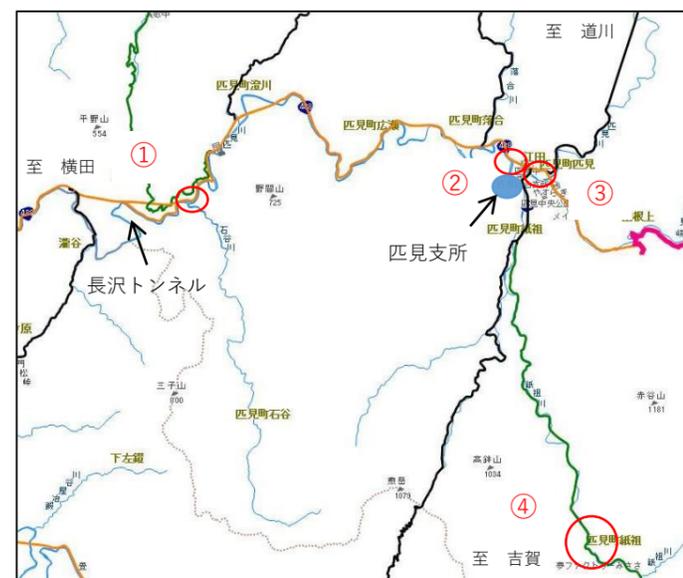

#### 【今年度の規制予定】

番号	場所	期間	備考
①	匹見町澄川	～令和3年2月まで	片側交互通行
②	匹見町匹見	～令和3年3月まで	片側交互通行及び全面通行止め
③	匹見町匹見	～令和3年8月まで	片側交互通行
④	匹見町紙祖	～令和3年1月まで	片側交互通行及び全面通行止め

※規制期間、規制方法については予定であり変更する可能性があります。

#### 【問い合わせ先】

島根県 益田県土整備事務所  
土木工務第一課  
課長：石川 担当：加藤、杉原、今若  
TEL：(0856)-31-9665
