


東岩坂バイパス工区位置図

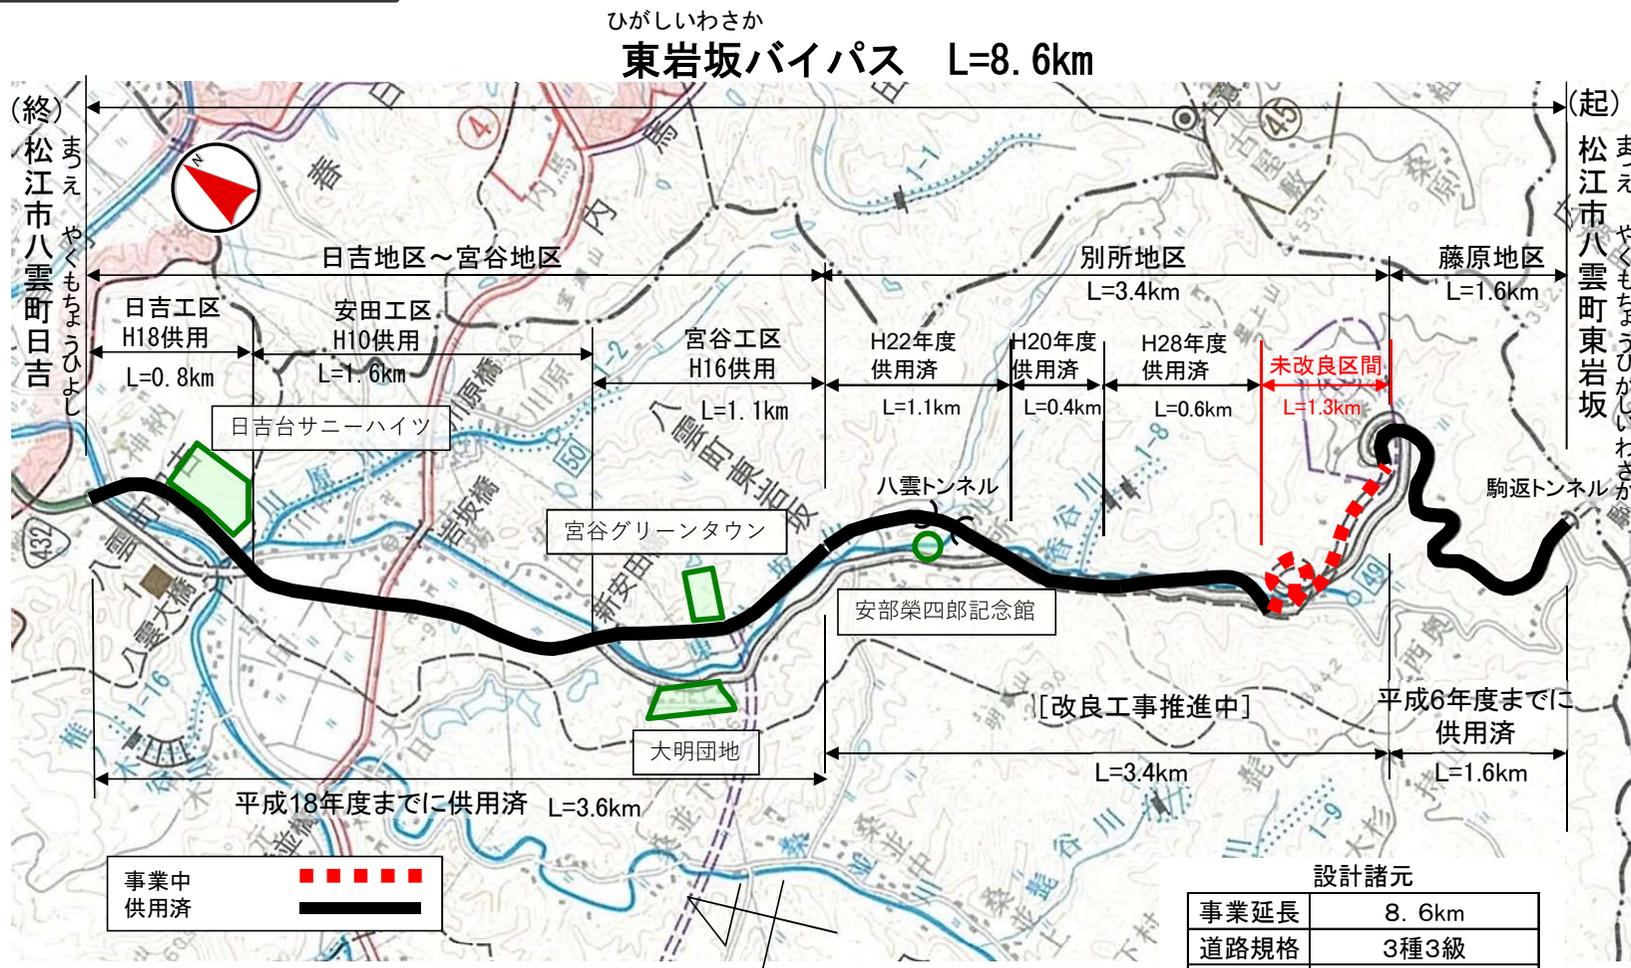

国道432号 東岩坂バイパス 各年度事業費

単位：億円（税抜）

年度	H25時点		H30時点		差（H30-H25）
S54～H23	119.51	実績	119.51	実績	0.00
H24	1.40	実績	1.40	実績	0.00
H25	1.71	見込	1.84	実績	0.13
H26	2.67	見込	1.45	実績	▲ 1.22
H27	3.62	見込	0.52	実績	▲ 3.10
H28	3.71	見込	1.24	実績	▲ 2.48
H29	3.62	見込	0.67	実績	▲ 2.95
H30	3.62	見込	0.62	見込	▲ 3.00
H31	3.62	見込	1.26	見込	▲ 2.36
H32	3.62	見込	1.75	見込	▲ 1.87
H33	3.62	見込	3.77	見込	0.15
H34	3.63	見込	3.38	見込	▲ 0.25
H35			4.73	見込	4.73
H36			5.28	見込	5.28
H37			3.42	見込	3.42
H38			4.52	見込	4.52
合計	154.34		155.34		1.00
					1.10

←税抜

←税込

※H28,H29年度に落石対策工事を追加実施したため、前回再評価（H25時点）の全体事業費より1.1億円増額となった
