

(一)出雲平田線 道路交通安全施設等整備事業補助(通学路緊急対策) 西代工区

令和4年度第2回再評価委員会 (現地調査)
道路建設課


■事業概要

今回整備区間は、歩道が未整備であるが、登校・通学者が利用している状況であり、通勤時間帯には危険な状況となっている。このため、本事業で現道拡幅、自転車歩行者道の整備することで安全性の向上を図るものである。


【整備状況】

事業採択	平成25年度 (2013年)	進捗率 59% (事業費ベース)
用地着手	平成25年度 (2013年)	進捗率 87% (事業費ベース)
工事着手	平成25年度 (2013年)	進捗率 50% (事業費ベース) 280mを令和4年8月供用
完成予定	令和8年度 (2026年)	

【横断図】

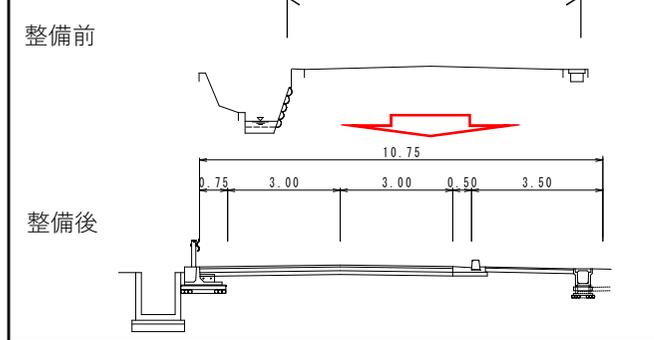

【平面図】

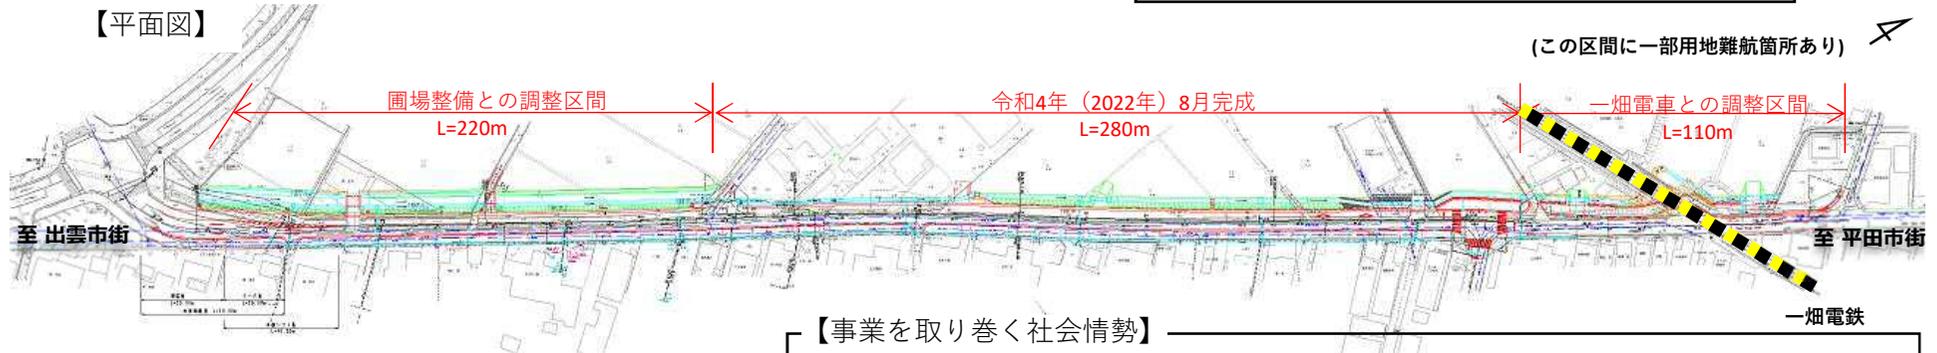

【状況写真(整備前)】



【事業を取り巻く社会情勢】

通学路の緊急合同点検において要対策箇所として判定



出雲市HPより
出雲市通学路交通安全プログラム「通学路危険箇所対策一覧表」及び「通学路
対策箇所図」について

踏切道改良促進法による改良が必要な踏切道に指定
指定基準：

通学路に該当するものであって幼児、児童、生徒又は学生の
通行の安全を特に確保する必要があるもの
(通学路交通安全プログラムに位置付け有り)

