

## 水力発電所リニューアル事業の進捗状況


## 1. 水力発電所リニューアル事業

- ・FIT制度を活用し、H26年度から老朽化した水力発電所のリニューアルに着手
- ・令和3年度から第4次リニューアルとして2発電所を事業化
- ・令和5年度に水力発電所リニューアルにかかる全ての事業が完了する予定

区分	発電所名	出力 (kW)	事業期間	概算事業費 (億円)	運転再開 (予定)
第1次	八戸川第二発電所	2,500	H26～H27	6.2	H28年4月
	八戸川第一発電所2号機	1,500	H26～H28	4.2	H28年9月
	飯梨川第二発電所	1,400	H26～H28	4.3	H29年3月
	三成発電所	3,150	H26～H30	13.9	H31年4月
第2次	三隅川発電所	7,900	H27～R4	68.6	R5年4月
	八戸川第一発電所1号機	4,999	H28～R2	39.8	R3年4月
	飯梨川第一発電所	3,000	H27～R3	35.0	R3年6月
第3次	飯梨川第三発電所	270	H30～R3	2.8	R4年4月
第4次	勝地発電所	770	R3～R5	5.6	R6年2月
	八戸川第三発電所	240	R3～R5	3.7	(R6年3月)
合 計		25,729		184.1	

## 2. 主な水力発電所リニューアル事業

### (1) 勝地発電所（令和6年2月2日運転再開）

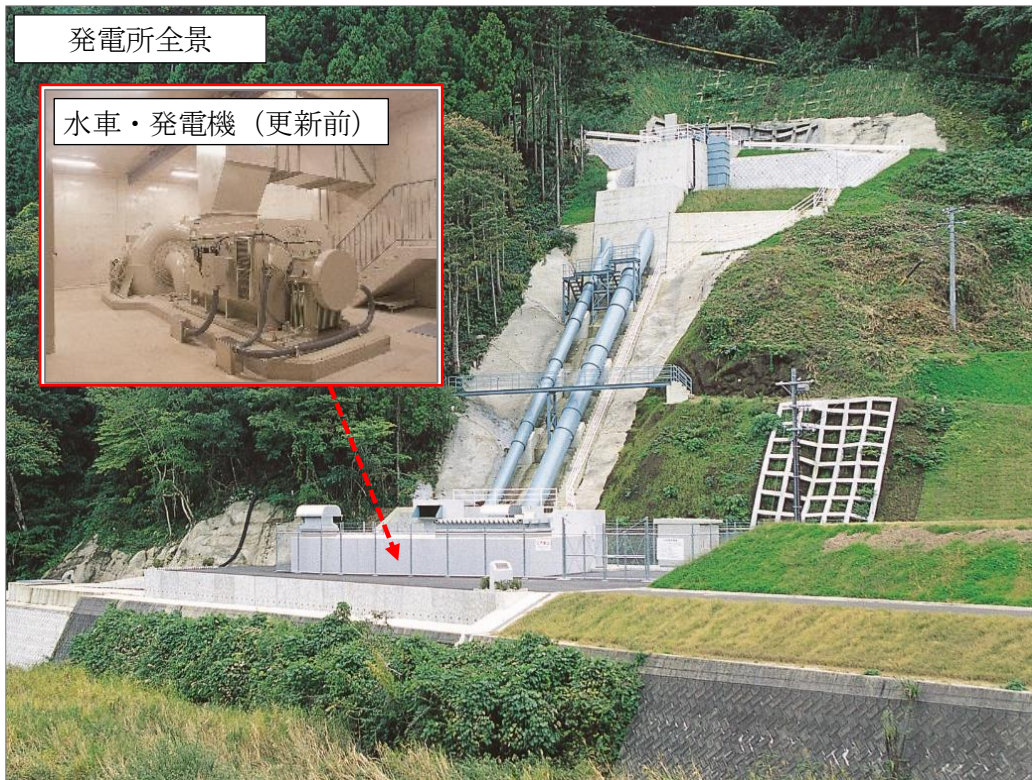



(2)八戸川第三発電所（現地施工中:令和6年3月運転再開予定）

