


実績データ①

| | | | | |
|----------------|---------------------|-------|--|--------------------|
| 技術名 | 石州瓦コンクリート舗装 | | | |
| 施工年度 | H25. | 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・観光施設の道路舗装に、周囲の景観との調和が求められるため、石州瓦コンクリート舗装が採用された。 ・粗骨材に規格外瓦を有効活用することでリサイクル性が向上した。 ・粗骨材(規格外石州瓦100%)の供給コストが割高で、経済性は普通コンクリート舗装と比較して8.6%低下した。 | |
| 発注機関 (担当部署) | 有限会社KKN | | | |
| 工事名 | KKNきんた農園ゲストハウス他新築工事 | | | |
| 施工箇所 | 島根県浜田市金城町 | | | |
| 請負業者 | 株式会社伊原組 | 問合せ先の | 会社名 | 株式会社サンクラフト |
| 施工数量 | 189m ² | 技術の | TEL | 0855-27-0077 |
| | | | E-mail | soumu@sankraft.com |

【施工状況】

(計画平面図)

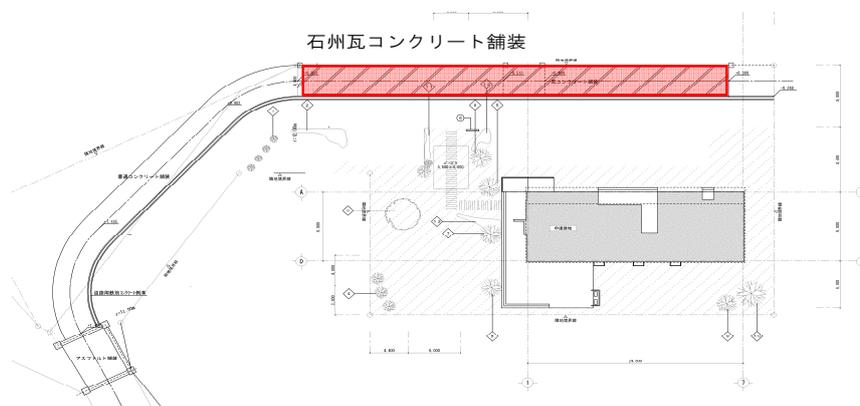

(施工前)



(施工中)



(施工後)

