

浜田川総合開発事業（第二浜田ダム建設、浜田ダム再開発）


来年度完成に向けて浜田ダム再開発を進めています！

平成26年3月から進めている浜田ダム再開発工事は平成31年1月末現在で、進捗率が83.3%となり、みなさまのご協力により完成が見えてきました。

越流式洪水吐（ダム本体の上部にある放流口。洪水時に水が流れる箇所。）を拡大するための取壊し作業が完了し、新たに追加する導流壁（放流口から流れる水を下流へ導く壁）のコンクリート打設を11月に開始しました。現在は、右岸側から水を流しながらダム本体のコンクリート打設、左岸側の放流管内部の改造及び減勢工の工事を行っております。


ダム本体の改造工事（導流壁・越流部のコンクリート打設 平成30年11月～平成31年6月頃）

現在、ダム本体の導流壁のコンクリート打設を下から順に進めております。昭和30年代後半に建設した既設コンクリート部と付着力を高めて新設部と一体的な構造物となるように、既設部を粗に加工してから新設部のコンクリート打設を実施しております。

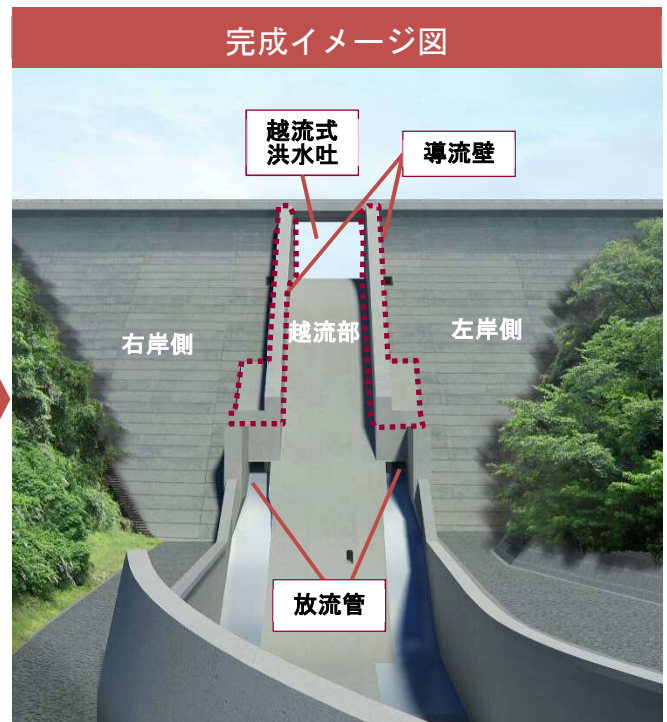


左岸放流管呑口の改造工事（絞込み加工）

既設放流管呑口（上流側）の大きさでは、ダム下流へ放流する量が多いため、呑口で絞る改造を行っております。呑口部最上流端部にはステンレスのカバーを取り付けた後、既設部と新設部の隙間はモルタルで充填します。

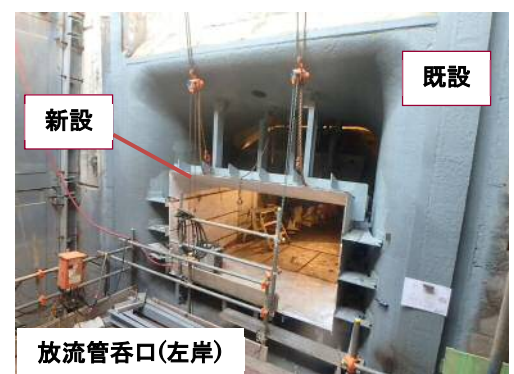

浜田ダムの通行規制について

浜田ダム天端に設置しています、仮橋の上流から下流への移動を行うため今年の5月中旬頃に通行規制を予定しております。時期が近づきましたら現場周辺の工事看板等でお知らせしたいと考えております。ご不便をおかけいたしますがご協力のほど何卒よろしく申し上げます。

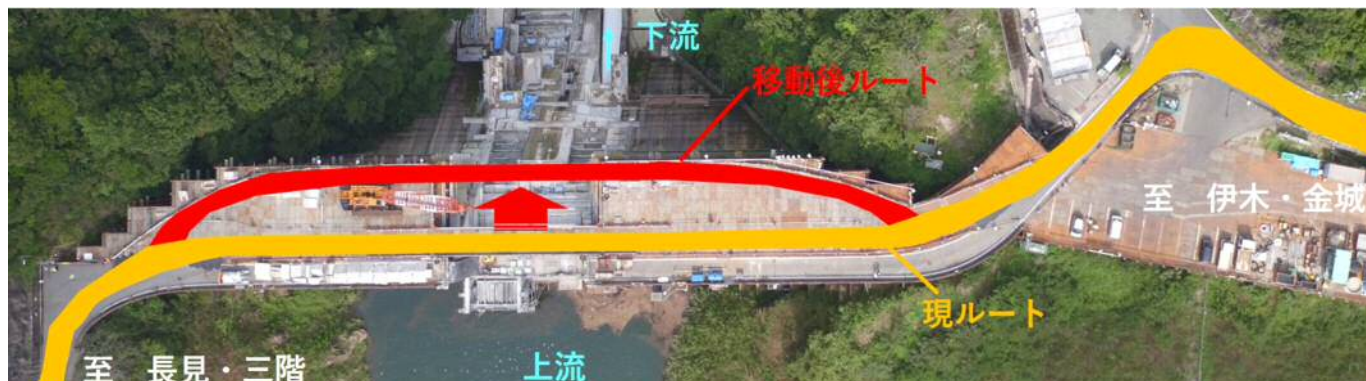

移設イメージ図

Coffee break～ 浜田ダム建設時状況 ～

昭和36年(1961年)に本体着工、昭和38年(1963年)で完成した浜田ダム建設当時の状況をご紹介します。諸先輩方が作業されている状況をご覧ください。



お問い合わせ先

安心して暮らせる地域のために！ 島根県浜田河川総合開発事務所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 島根県浜田合同庁舎5F
TEL 0855-29-5760 (代表、夜間・休日連絡先) FAX 0855-29-5772
<https://www.pref.shimane.lg.jp/hamadakasen/>
メールアドレス: hamadakasen@pref.shimane.lg.jp
