



江津市PRキャラクター
「人麻呂くん」

(仮称)

市山第二トンネル通信

江津市PRキャラクター
「よさみ姫」



No.3: 令和元年7月発行

昼夜作業の開始について



防音扉組立状況

トンネル掘削は順調に進み、全体の四分の一程度の約60mが完了しています。トンネルの進行に伴い、下記の予定で昼夜作業を開始いたしますので、お知らせいたします。

23日には発破時の振動・騒音の低減のため、トンネル入口に防音扉を設置します。

近隣の皆さまにはしばらくの間ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

夜間作業開始予定日：7月29日(月)夜より

主な作業内容：トンネル掘削(発破2~3回)

振動・騒音の対策について

発破等の工事で発生する振動・騒音については、市山側で常時、計測を行っています。

その場で数値を確認するだけでなく、インターネットを通じてデータを集め、振動・騒音が基準値を超えると現場にメールが発信され、すぐに対策がとれるような体制をとっています。



雲太(騒音・振動遠隔監視システム)

お問い合わせ先

発注者

島根県 土木部
浜田県土整備事務所 土木工務第三課
課長：岡崎 洋
監督員：伊藤 祐次
TEL：0855-29-5658

発行者・施工業者

今井産業・日新建設特別共同
企業体
所長：黒田 裕三
事務主任：中原 幸生
TEL：0855-92-8097

現在の作業内容




インバートコンクリート完了

7月15日からはトンネル掘削を一時中断し、インバートコンクリートの施工を行いました。

インバートコンクリートはトンネルの出入口などの山が軟弱な箇所の変形や沈下を防止することが目的です。トンネルの底の部分にコンクリートを打設することで、トンネル全体をコンクリートで巻いたような形になります。

トンネル掘削の進行(7月22日現在)

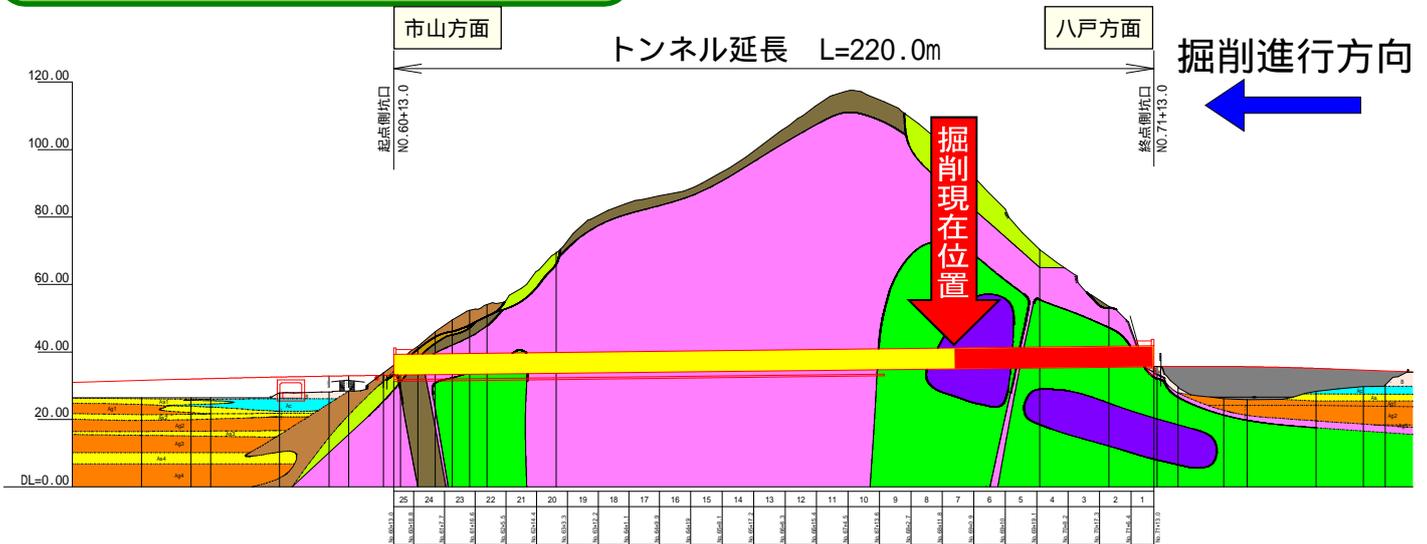

工事の概要

工事の名称

(主)桜江金城線(市山3工区)
防災安全交付金(改築)(仮称)
市山第二トンネル工事

工事の場所

島根県江津市桜江町
市山地内

工事の期間

平成31年3月2日
～令和2年6月1日

工事の内容

トンネル延長220m
幅員 W=8m
掘削工法 NATM(発破掘削)
他

桜江金城線
トンネル

