# 島根原子力発電所の運転実績（平成１６年度）

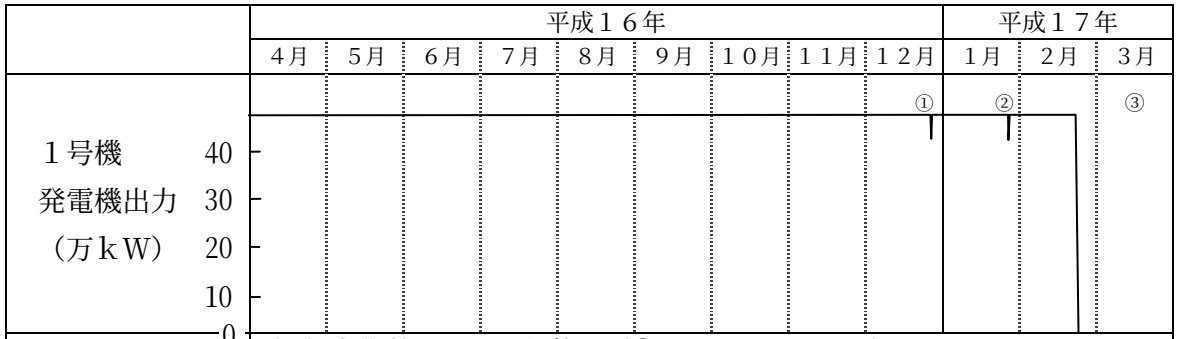


記事

（１）制御棒パターン調整　（①Ｈ１６．１２．２４）
（②Ｈ１７．１．２６）
（２）第２５回定期検査　（③Ｈ１７．２．２０　～　）

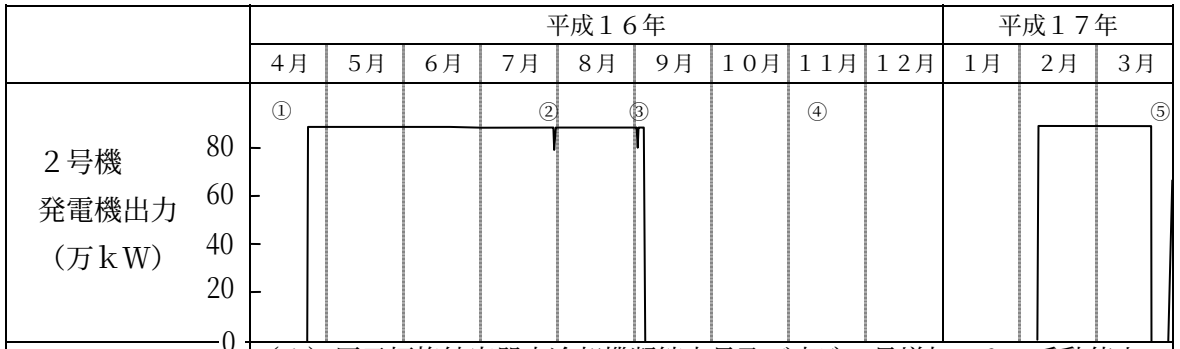


記事

（１）原子炉格納容器内冷却機凝縮水量及び床ﾄﾞﾚﾝ量増加による手動停止
（①Ｈ１６．３．１８　～　Ｈ１６．４．２０）
（２）制御棒パターン調整　（②Ｈ１６．７．３０　～　Ｈ１６．７．３１）
（③Ｈ１６．９．２）
（３）第１２回定期検査（Ｈ１６．９．７　～　Ｈ１７．３．３）
（発電停止期間：④Ｈ１６．９．７　～　Ｈ１７．２．６）
（４）Ｂ－原子炉再循環ポンプメカニカルシール取替のため停止
（⑤Ｈ１７．３．２６　～　Ｈ１７．３．３１）

## １．運転実績

| 項目 | 単位 | １号機 | ２号機 |
|---|---|---|---|
| 発電時間 | h | 7,801:00 | 4,520:15 |
| 発電電力量 | 万ｋＷｈ | 365,442.9 | 367,890.5 |
| 設備利用率 | % | 90.7 | 51.2 |

## ２．放射性気体廃棄物放出管理実績

単位：Bq／年

| | 放射性希ガス | 放射性よう素 I-131 |
|---|---|---|
| １号機 | ※ＮＤ | ※ＮＤ |
| ２号機 | ※ＮＤ | ※ＮＤ |
| 放出管理目標値 | $2.5\times10^{15}$ | $1.3\times10^{11}$ |
| サイトバンカ建物 | ――― | ※ＮＤ |

※検出限界値未満

## ３．放射性液体廃棄物放出管理実績

単位：Bq／年

| | トリチウムを除く | トリチウム |
|---|---|---|
| １号機放水口 | ※1 ＮＤ | $2.8\times10^{11}$ |
| ２号機放水口 | ※1 ＮＤ | $3.5\times10^{11}$ |
| 放出管理目標値 | $7.4\times10^{10}$ | ※2 $7.4\times10^{12}$ |

※1 検出限界値未満
※2 年間放出管理の基準値

## ４．２号機 第１２回定期検査

| | |
|---|---|
| 発電停止日 | 平成１６年　９月　７日 |
| 発電開始日 | 平成１７年　２月　６日 |
| 定期検査終了日 | 平成１７年　３月　３日 |
| 発電開始日までの期間 | １５３日 |
| 定期検査終了までの期間 | １７８日 |

様式 Ｈ－２－②
別紙－１
