漂着ごみスケジュール

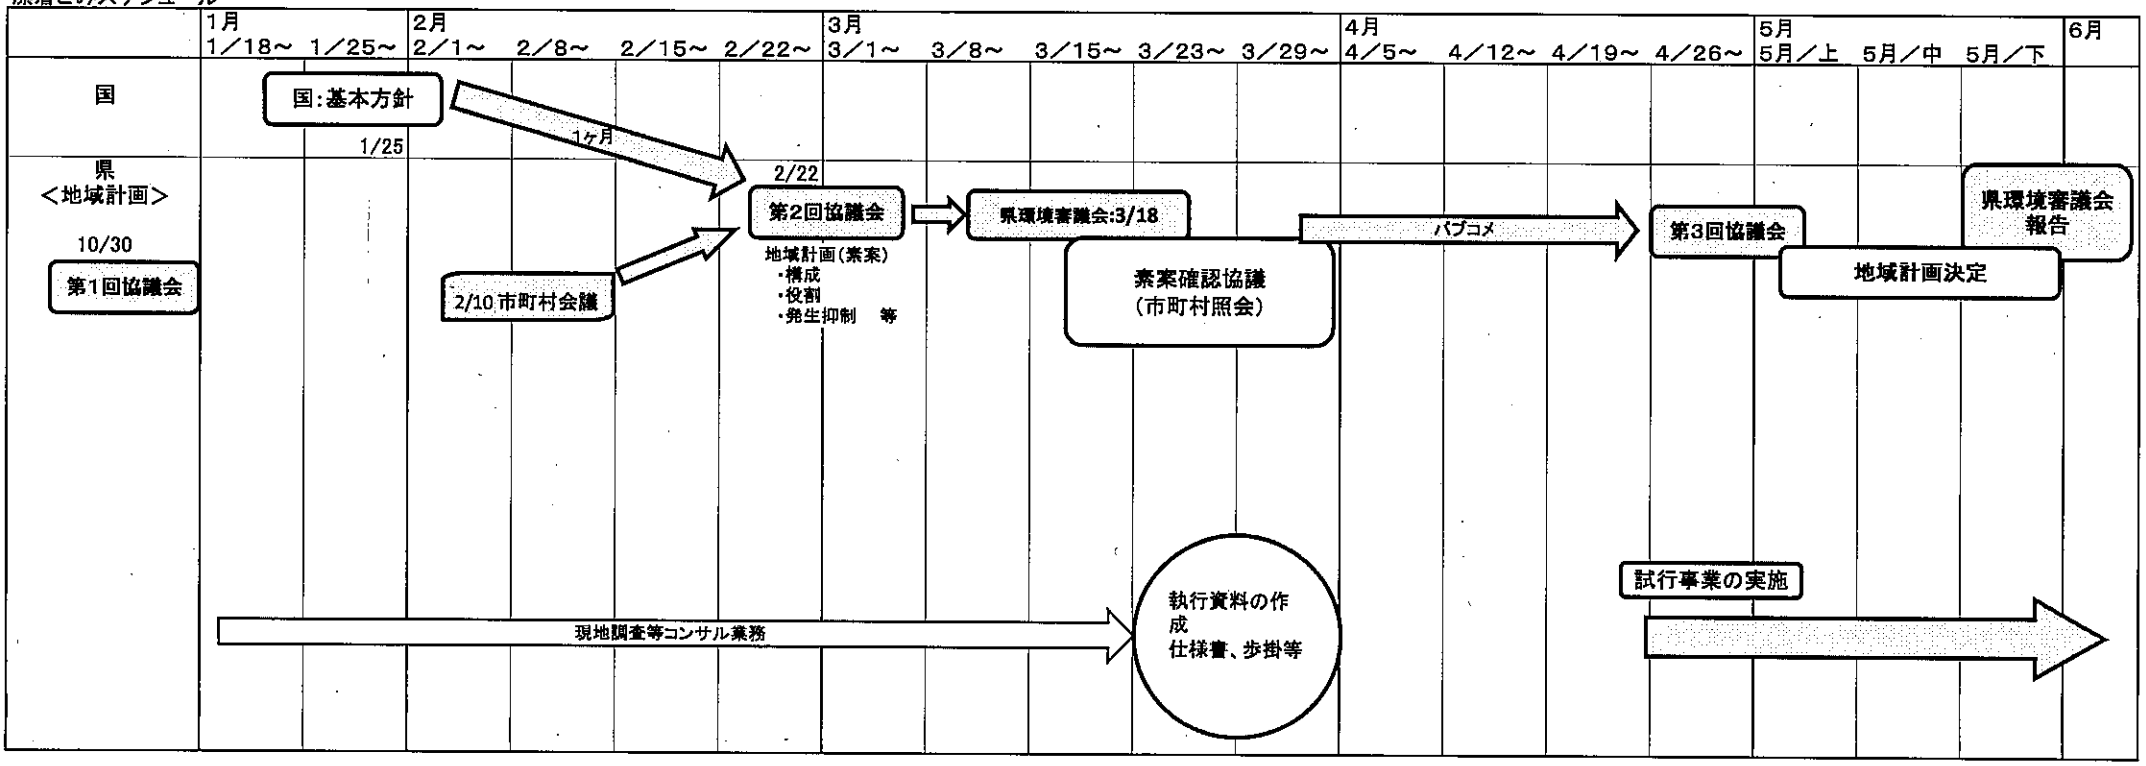
1月
1／18～ 1／25～
2月
2／1～ 2／8～ 2／15～ 2／22～
3月
3／1～ 3／8～ 3／15～ 3／23～ 3／29～
4月
4／5～ 4／12～ 4／19～ 4／26～
5月
5月／上 5月／中 5月／下
6月
国
国:基本方針
1/25
1ヶ月
県
＜地域計画＞
10/30
第1回協議会
2/10 市町村会議
2/22
第2回協議会
地域計画(素案)
・構成
・役割
・発生抑制 等
県環境審議会:3/18
素案確認協議
(市町村照会)
パブコメ
第3回協議会
県環境審議会
報告
地域計画決定
現地調査等コンサル業務
執行資料の作成
仕様書、歩掛等
試行事業の実施

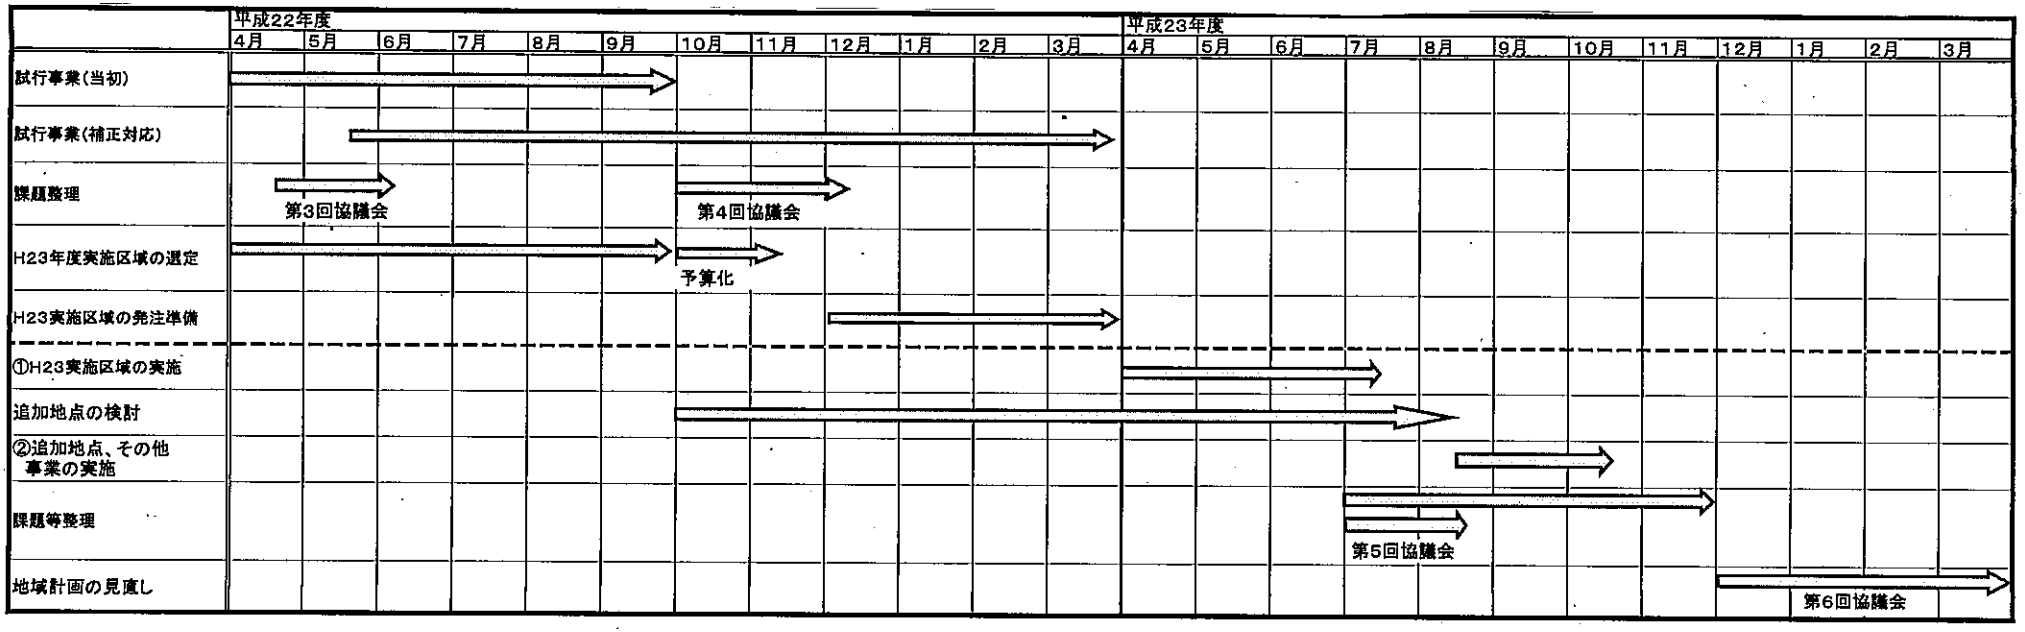
平成22年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
試行事業(当初)
試行事業(補正対応)
課題整理
第3回協議会
第4回協議会
H23年度実施区域の選定
予算化
H23実施区域の発注準備
①H23実施区域の実施
追加地点の検討
②追加地点、その他
事業の実施
課題等整理
第5回協議会
地域計画の見直し
第6回協議会
