

令和5年度 第4回島根県公共事業再評価委員会

日 時：令和5年10月30日（月） 13：00～17：00（予定）
場 所：島根JAビル 本館 5階 大会議室

議 事 次 第

1. 開会

2. 挨拶

3. 議事


(1) 再評価対象事業箇所の審議、対応方針の決定

4. 閉会

第4回委員会（対応方針の決定） 審議フロー

対象事業箇所ごとに以下を繰り返す

再評価担当課	宿題、追加資料等の説明（あれば）
	↓
会長	担当委員に対応方針について意見聴取
	↓
担当委員	対応方針に対する意見
	↓
会長	他の委員への意見聴取
	↓
他の委員	補足意見（あれば）
	↓
会長	委員会としての対応方針の確認
	↓
委員	了承
	↓
	対応方針の決定

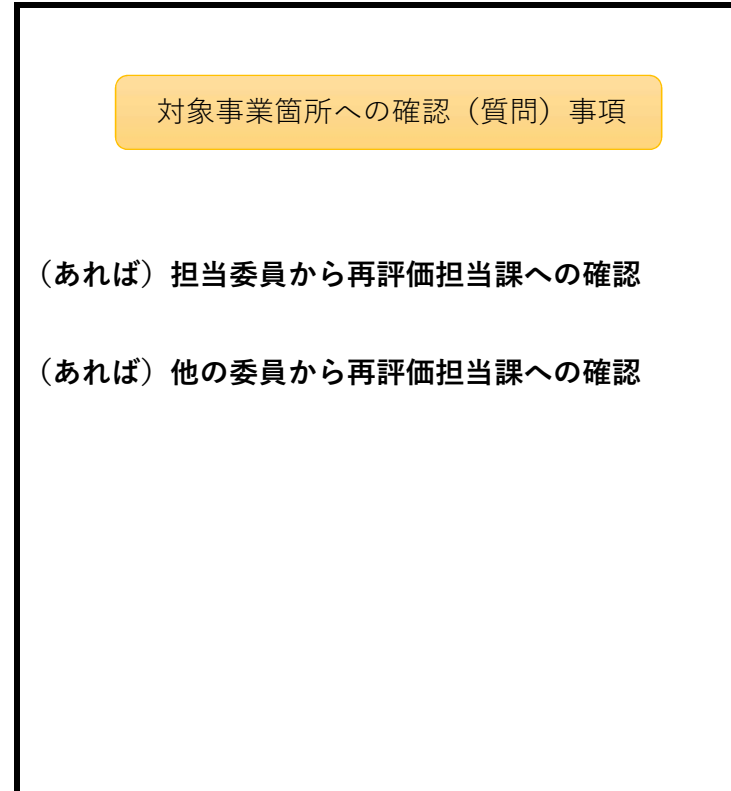

令和5年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	事業費 変更理由	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%) ※1	前回 評価時 進捗率 (%) ※2	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分 ※3	今後の 方針 ※4	抽出 事業	鳥根創生計画での位置付け		
																	基本 目標	政策	施策
1	水産課	農山漁村地域整備交付金 (地域水産物供給基盤整備事業)	津戸地区	隠岐の島町	5.9	①、③	2014 (H26)	2025 (R7)	10	74	-	1.15	②	交付金	継続		Ⅲ	4	(3)
					8.3														
2	水産課	農山漁村地域整備交付金 (地域水産物供給基盤整備事業)	加茂地区	隠岐の島町	5.2	①	2014 (H26)	2025 (R7)	10	82	-	1.38	②	交付金	継続		Ⅲ	4	(3)
					6.2														
3	道路建設課	国道432号 社会資本整備総合交付金事業	東岩坂バイパス	松江市	163.0	①	1979 (S54)	2033 (R15)	55	71	82 (H30) 【抽出】	1.00	④	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					190.3														
4	道路建設課	(一)八重垣神社竹矢線 防災安全交付金事業	大庭工区	松江市	9.5	①	2009 (H21)	2027 (R9)	19	68	-	0.87	②	交付金	継続		Ⅷ	2	(3)
					13.4														
5	道路建設課	(一)安来インター線 社会資本整備総合交付金事業	島田2工区	安来市	38.0	③	2009 (H21)	2029 (R11)	21	62	29 (H30)	1.74	④	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					47.8														
6	道路建設課	(主)出雲三刀屋線 社会資本整備総合交付金事業	上塩冶工区	出雲市	25.2	②	2009 (H21)	2027 (R9)	19	77	70 (H30)	1.62	④	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					30.1														
7	道路建設課	(一)斐川上島線 社会資本整備総合交付金事業	武部2工区	出雲市	45.4	②	2014 (H26)	2026 (R8)	13	81	-	0.98	②	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					65.3														
8	道路建設課	(一)草野横田線 防災安全交付金事業	東比田2工区	安来市	6.6	③	2014 (H26)	2028 (R10)	15	71	-	0.66	②	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					11.2														
9	道路建設課	(一)益田種三隅線 防災安全交付金事業	西河内工区	浜田市	3.0	④	2014 (H26)	2025 (R7)	12	52	-	-	②	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					4.2														
10	道路建設課	(一)津和野須佐線 防災安全交付金事業	中曽野工区	津和野町	4.2	③	2014 (H26)	2026 (R8)	13	52	-	-	②	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					5.8														
11	河川課	矢原川ダム建設事業	矢原川ダム	浜田市 益田市	220.0	④	1994 (H6)	2034 (R16)	41	31	11 (H30) 【抽出】	1.7	④	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					240.0														
12	河川課	大規模特定河川事業	湯谷川	出雲市	228.8	-	1968 (S48)	2047 (R29)	80	66	55 (H30)	5.20	④	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					228.8														
13	河川課	広域河川改修事業	佐陀川	松江市	80.8	①	1997 (H9)	2045 (R27)	49	29	21 (H30)	1.34	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					88.2														
14	河川課	広域河川改修事業	斐伊川(横田)	奥出雲町	20.1	①	1988 (S63)	2028 (R10)	41	90	86 (H30)	1.69	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					20.2														
15	河川課	広域河川改修事業	新内藤川	出雲市	408.8	①	1985 (S60)	2038 (R20)	54	77	69 (H30)	12.38	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					466.7														
16	河川課	広域河川改修事業	十間川	出雲市	60.6	-	1975 (S50)	2031 (R13)	67	75	61 (H30)	4.05	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					60.6														
17	河川課	総合流域防災事業	忌部川	松江市	29.3	①	1975 (S50)	2027 (R6)	53	91	90 (H30)	2.60	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					30.4														
18	河川課	総合流域防災事業	吉田川	安来市	36.9	①	1952 (S27)	2028 (R10)	77	95	86 (H30) 【抽出】	7.11	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					45.2														
19	港湾空港課	臨港道路整備事業	浜田港 福井・長 浜地区	浜田市	12.4	-	2019 (R1)	2028 (R10)	10	46	-	3.02	⑥	補助	継続		Ⅲ	4	(2)
					12.4														
20	港湾空港課	港湾改修事業	益田港 高津地区	益田市	53.4	③	1994 (H6)	2028 (R10)	35	68	63 (H30) 【抽出】	1.54	④	交付金	継続		Ⅲ	4	(2)
					66.0														
21	砂防課	事業間連携砂防等事業	深山地区	出雲市	1.7	①、③	2019 (R1)	2025 (R7)	7	70	-	6.97	⑥	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					3.0														
22	砂防課	事業間連携砂防等事業	旭が丘地区	出雲市	2.5	①、③	2019 (R1)	2026 (R8)	8	58	-	8.22	⑥	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					3.7														
23	砂防課	事業間連携砂防等事業	三保市谷	飯南町	0.9	①、③	2020 (R2)	2026 (R8)	7	45	-	3.17	⑥	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					1.3														

(注) 現段階では記入できない欄があれば空欄としてください。

再評価委員会へ審議依頼を予定している市町村事業があれば記入してください。

事業費：億円単位で小数点1位(千万円単位)まで

【下段】令和5年度時点、

【上段】再評価未実施の事業の場合：採択時点、再評価既実施の場合：前回評価時点

※1 令和5年度(当初)までの事業費で記載。

※2 初めて評価する場合は「-」として記載。

※3 補助、県単、交付金の区分を記入。

※4 継続、中止、休止、計画変更の区分を記入。

●事業費 変更理由

- ①物価変動 ②土質変化 ③工種の増減 ④その他

●再評価区分(再評価対象事業)

- ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業 ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)
 ②事業採択後10年を経過している継続中の事業 ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)
 ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業 ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業
